




Vysočanská - rekonstrukce havarijního stavu

Typ stavby: Rekonstrukce komunikace

Číslo akce: 999085

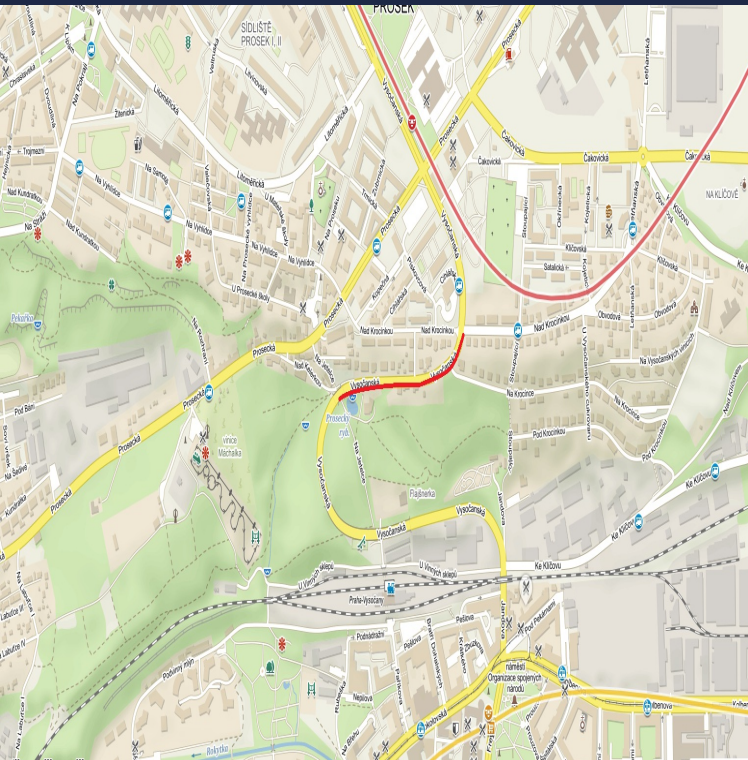

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Termín: 3. 7. 2017 - 21. 12. 2017

Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci po havárii vozovky v úseku Na Jetelce - Nad Krocínkou.

V 07/2016 zde došlo po havárii kanalizace k propadu vozovky. Jedná se o kompletní rekonstrukci vozovky a podloží. Dále dojde k opravě chodníků a autobusových zálivů.

Zhotovitel: Vysočanská Colas - Čermák a Hrachovec

Projektant: Ko-Ka, s.r.o.

TDI TSK Ing. Lenka Zach

Začátek: Na Jetelce

Konec: Nad Krocínkou

Délka opravy: 415 m

Šířka opravy: Celá šířka komunikace a chodníků

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Termín: 3. 7. 2017 - 21. 12. 2017

Dopravní omezení: uzavírka komunikace mimo MHD

POPIS STAVBY

Stručně historie a vývoj akce Vysočanská

Úsek Na Jetelce-Nad Krocínkou

Dne 8.11.2016 proběhlo koordináční jednání mezi TSK, PVK, PVS ohledně řešení havarijního stavu ul. Vysočanská, kdy došlo k několika propadům vozovky. Ty byly způsobené pohyby podloží, čímž došlo ke zborcení stoky, následnými průsaky vody k další degradaci vozovkového podloží.

Jelikož se zde také nacházelo 18 UV v havarijním stavu, bylo na základě uzavřené SOD dohodnuta oprava těchto UV, které provede pro TSK společnost PVS jako sdruženou investici.

Od listopadu 2016 do 31.5. probíhaly práce PVK na sanaci havárie kanalizace, dále probíhaly práce v kompetenci PVS .

Až 3.7. byly zahájeny práce TSK na opravě vozovky v koordinaci s pokračujícími pracemi PVS, tedy staveniště nemohlo být uvolněno v plném rozsahu.

K termínu 15.8. byly dokončeny práce PVS a pokračují pouze práce TSK na rekonstrukci komunikace.

Stavba se provádí v režimu havárie, a proto nebyly dle standardních postupů zmapovány stavy ostatních inženýrských sítí v komunikaci. V průběhu stavby byly tedy zjištěny havarijní stavy vodovodních přípojek a NTL plynovodu. Vše bylo se správci předmětných zařízení okamžitě zkoordinováno a podrobně diagnostikováno a v rekordních termínech jsou prováděny jejich nezbytné opravy:

3.10. - zjištěny havarijní stavy vodovodních přípojek k obytným souborům - kompetence PVK- zdržení prací TSK o cca 10 - 14 dní

13.10. - zjištěn únik plynu z cca 30 let starého plynovodu - kompetence PPD , zajistí výměnu NTL řadu v termínu 18.10 - 28.10 - zdržení prací TSK o 10 dní

Přes výše uvedené koordinace, havárie a omezený prostor stavby(zachování provozu BUS) se podařilo zkrátit smluvní termín plynoucí z veřejné soutěže.

Předpoklad dokončení prací na vozovkách je 30.11.2017. Po tomto termínu bude obnoven automobilový provoz vždy v jednom jízdním pruhu v každém směru.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Termín: 3. 7. 2017 - 21. 12. 2017

Dopravní omezení: uzavírka komunikace mimo MHD

POPIS STAVBY

Úsek Nad Krocínkou - Prosecká

V koordinaci s PVS probíhá standardní projektová a inženýrská příprava rekonstrukce vodovodů, kanalizací a komunikace ve fázi pro stavební povolení, která by měla navazovat na havarijní úsek v r. 2018.

