



Štěrboholská radiála, 9. etapa - do centra

Typ stavby: Rekonstrukce komunikace

Číslo akce: 999 638/9



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Termín: 28.08. - 10.12.2016 - dle vydaného DIR

Zhotovitel: Strabag, a.s.

Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s.

TDI TSK Jana Holasová DiS.


Začátek: VO 16021

Konec: VO 16011

Délka opravy: Cca 550m

Šířka opravy: 9,8 - 12 m

Štěrboholská radiála, 9. etapa - do centra



DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Termín: 28.08. - 10.12.2016 - dle vydaného DIR


Částečné omezení, práce budou probíhat po jízdnicích pruzích.

Během postupu prací zůstanou zachovány dva jízdnicí pruhy pro každý směr jízdy, přičemž jeden z jízdnicích pruhů ve směru do centra bude převeden do protisměrného jízdnicího pásu (s šířkovým omezením 2 m). Současně bude vyznačena objížďka pro nákladní automobilovou dopravu ulicemi Průmyslová a Kbelská.



POPIS STAVBY

Jedná se celkovou výměnu konstrukčních vrstev levého (rychlého) a pravého (pomalého) pruhu komunikace Štěrboholská spojka ve směru do centra, v úseku vymezeném sloupy veřejného osvětlení, a sice VO 16021 - VO 16011, celkem cca 550 m. Betonové obruby u středního dělicího pásu budou vyměněny v celé délce za nové kamenné. Součástí stavby bude obnova vhodného odvodnění vozovky a dostatečná sanace komunikace. Stávající svodidla budou demontována a poškozené části vyměněny. Na opraveném povrchu bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

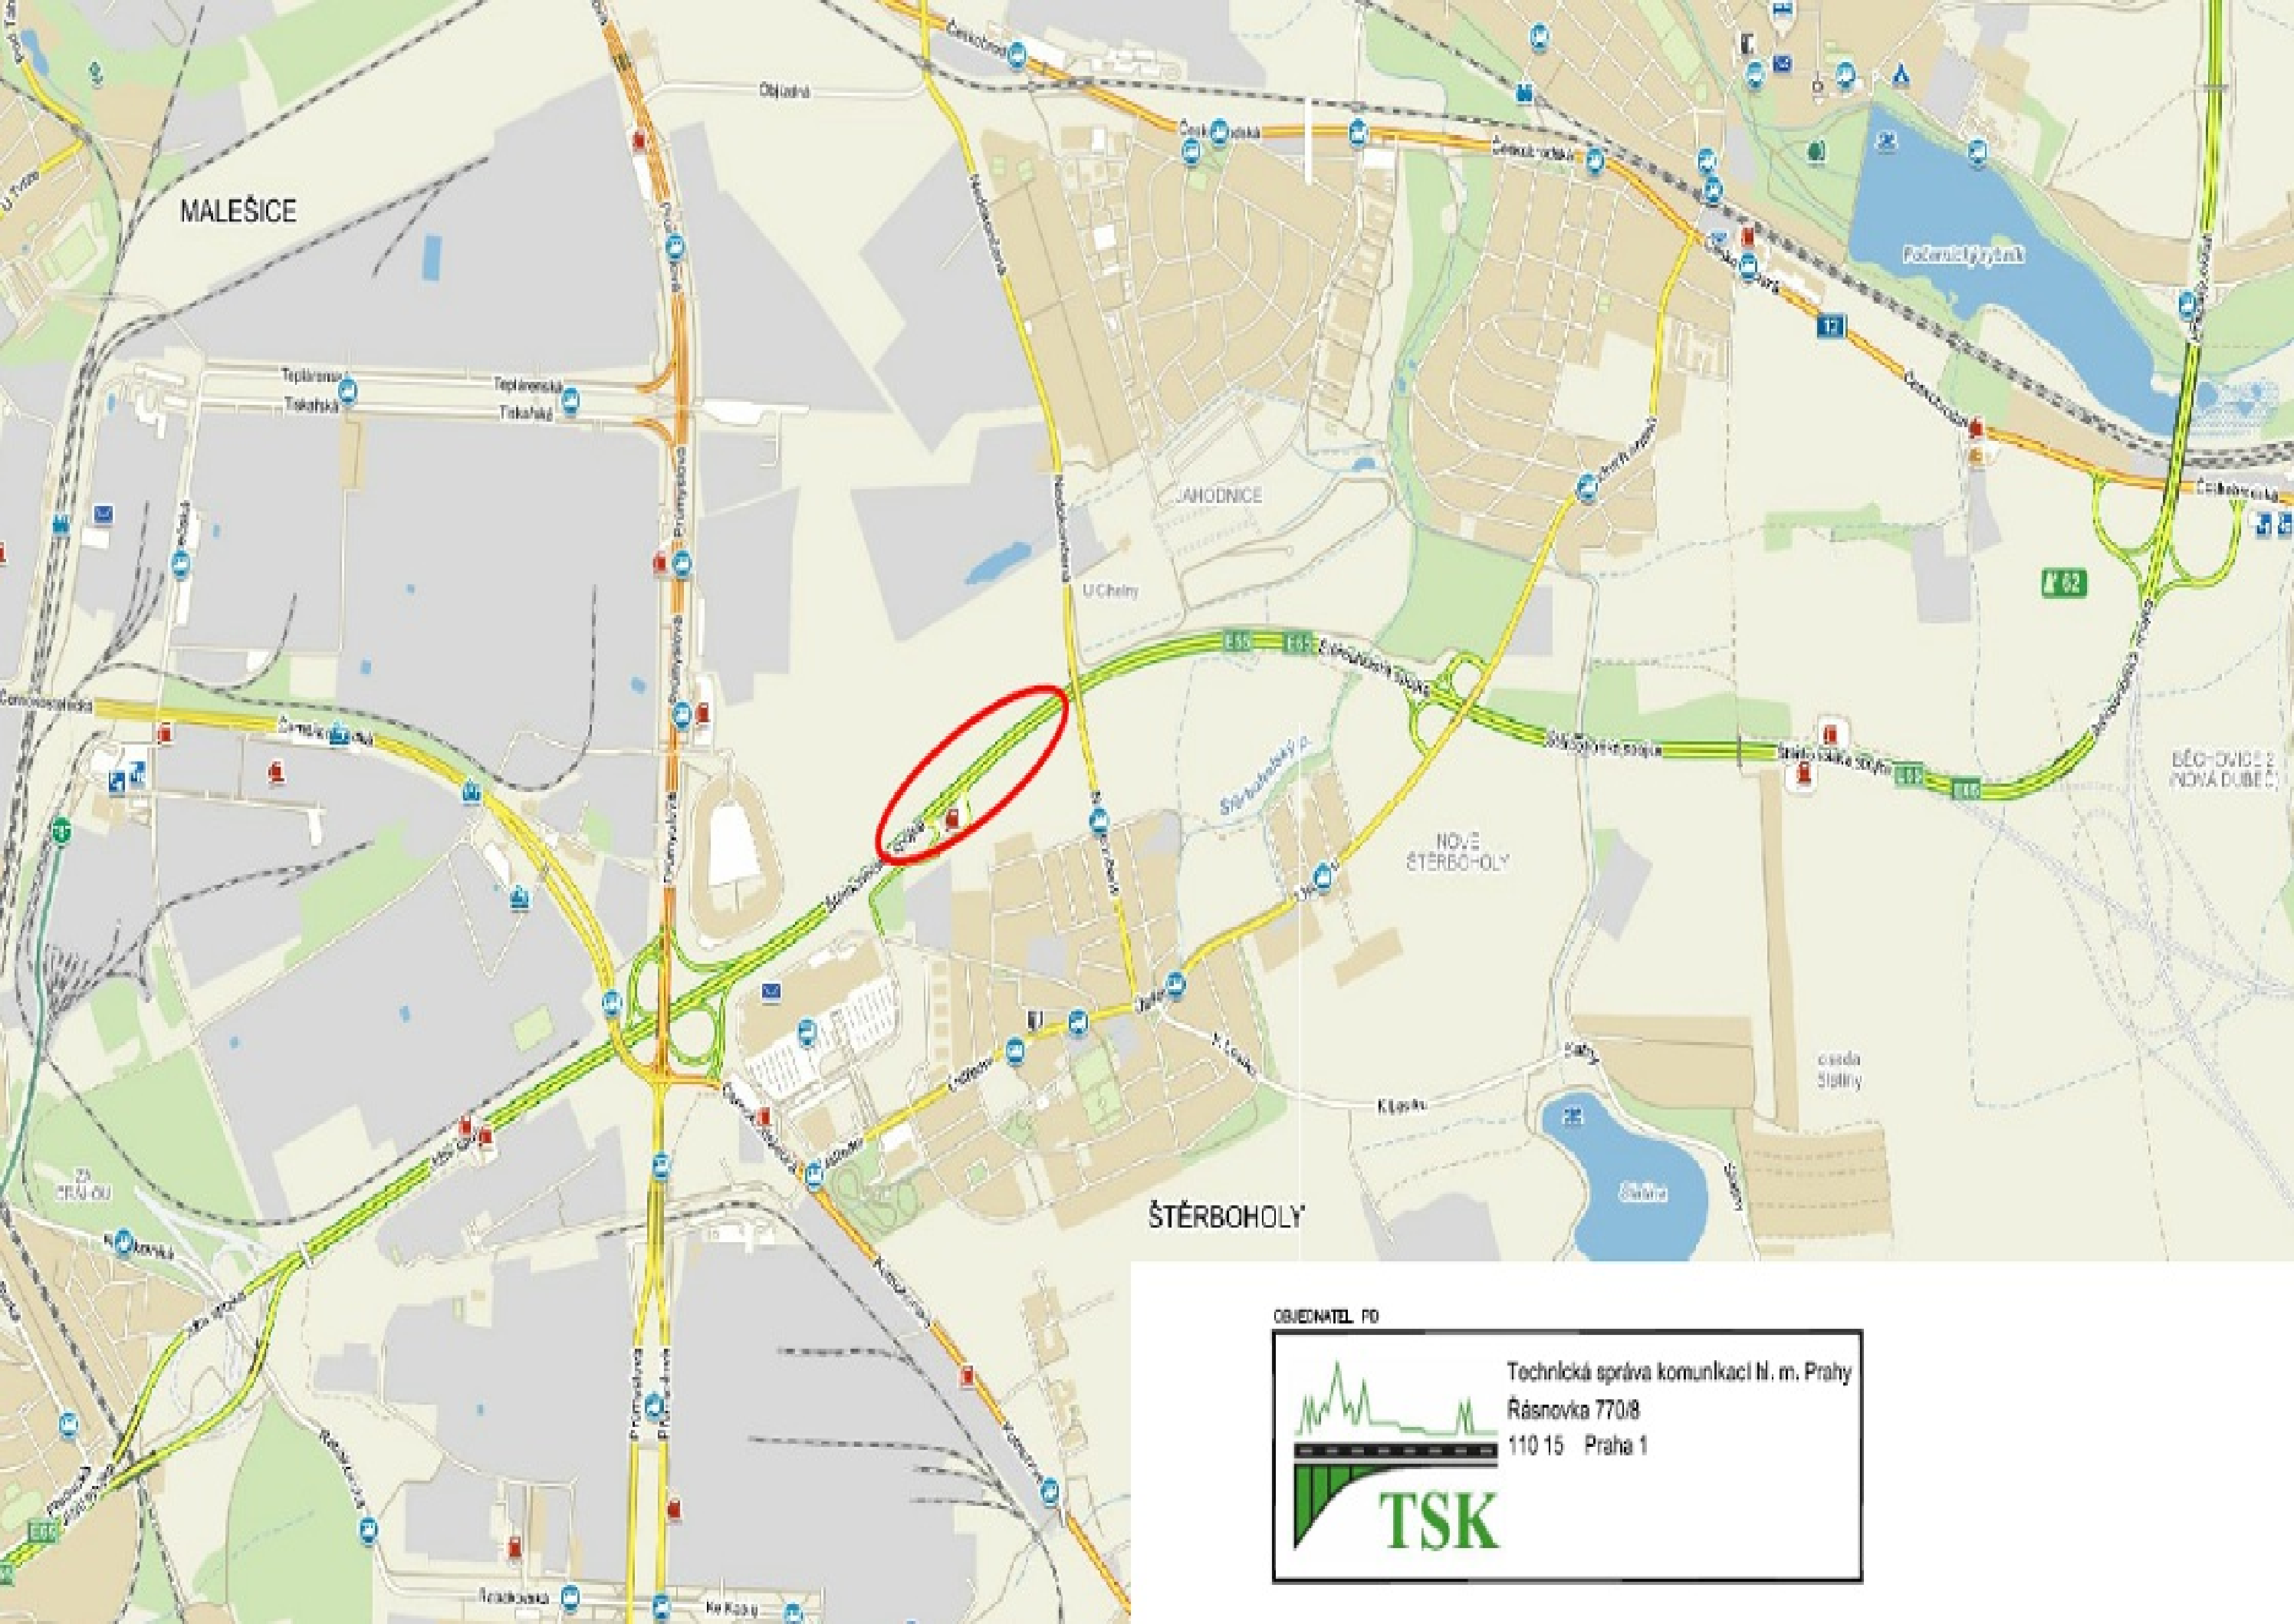

OBJEDNATEL PD



Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásovkova 770/8
110 15 Praha 1
