

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/103

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2145-841/TC/21/20/01

I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous - vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik odd. přípravy a realizace investic

#### Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s., č. účtu: 112071233/0300

zastoupená: Ing. Michael Procházka, na základě plné moci

Ing. Jan Černý, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

tel.: 602 316 311, e-mail: [michael.prochazka@strabag.com](mailto:michael.prochazka@strabag.com)

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

tel.: 602 227 269, e-mail: [jan.02.cerny@strabag.com](mailto:jan.02.cerny@strabag.com)

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát (vedoucí PJ)

tel.: 724 861 792, e-mail: [martin.pilat@strabag.com](mailto:martin.pilat@strabag.com)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost KO-KA s.r.o., Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, *Kancelář: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice.*

Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace Vysočanská v úseku Nad Krocínkou – Posecká v Praze 9. Dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky a sanaci podloží do hloubky 620 mm. V křižovatce a u odbočovacího pruhu bude provedena výměna pouze ložné a obrusné vrstvy. Dále budou vyrovnány obruby a rekonstruován chodník. Část chodníku bude dlážděna betonovou dlažbou, část bude z litého asfaltu.

Součástí předmětu plnění je:

- projekt a realizace DIO,
- měření hladiny hluku před zahájením a po dokončení stavby dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby.

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.  
(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 9, ulice Vysočanská, v úseku Nad Krocínkou – Prosecká.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a ve stanovené době předat objednateli dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 2017 s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatelem a hlavním městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako „HLMP“), když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „**Smlouva HLMP**“).
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

## III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení stavebních prací: ihned po podpisu smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv a dále dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel, ihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li objednatel pozdější termín.
2. Termín dokončení: **max. do ...107... kalendářních dnů od zahájení prací**

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: ...107... **kalendářních dnů**

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatelem s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

Zápisem do stavebního deníku potvrzeným zástupcem objednatele a zhotovitele je možné učinit přerušení stavebních prací. O toto přerušení se prodlužuje lhůta výstavby bez nutnosti změny smluvního vztahu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele do 5-ti pracovních dnů stavební práce obnovit.

3. Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu, s ohledem na platné zákony a předpisy, zejména pak týkající se BOZP, hygienických předpisů, apod.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.
5. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce odpovídá i přiložený harmonogram provádění prací.

#### **IV. Cena díla**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

**2. Celkem cena za dílo bez DPH : ..... 30 950 611,43 Kč**

**DPH: ..... 6 499 628,40 Kč**

**Cena celkem včetně DPH : ..... 37 450 239,83 Kč**

Cena je blíže specifikována v příloze smlouvy Položkový rozpočet.

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

#### **V. Platební podmínky**

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na

předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.
7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.

## VI.

### Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
  - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
  - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
  - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
  - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
4. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule dle manuálu Komunikační strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mít schválený rozměr a jednotný vzhled a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostatečném množství (minimálně dvou) dle délky úseku a významu komunikace k informování veřejnosti o připravovaném dopravním omezení s dostatečným předstihem před zahájením prací (ideálně 7 dní předem). Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR).

Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umístování těchto informačních tabulí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že

*je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné zakázky v době jejího plnění, neboť má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky, což dokládá smlouvou o budoucí spolupráci, přičemž tuto smlouvu o budoucí spolupráci přikládá jako přílohu k této smlouvě.*

6. Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl.VI. odst. 5. této smlouvy zhotovitel dokládá plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění díla v km, po které bude zhotovitel zajišťovat dodávku potřebného množství asfaltových směsí na stavenišťě, s detailním rozpisem časů a průměrné rychlosti vozidla přepravujícího požadovanou asfaltovou směs, aby mohl objednatel prověřit reálnost dojezdové vzdálenosti a kvalitu dovážené směsi na stavenišťě, v souladu s relevantními technickými normami TKP 7. Objednatel si vyhrazuje právo každou z doložených obaloven uvedených zhotovitelem prověřit oddělením laboratoře objednatel.

## VII.

### Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník (též „SD“ bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
  - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
  - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatel.
  - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
  - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
  - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatel nebo uvedeno stanovisko objednatel nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat stavební dozor.

## VIII.

### Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací

řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.

2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.  
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
  - originál SD
  - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK).
  - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
  - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
  - geometrické plány
  - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
  - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
  - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
  - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
  - vyjádření správců inž. sítíZhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

## IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na **60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení.**

Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.

2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.
5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

## **X. Smluvní pokuty**

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně (mj. jde i o neefektivní využívání možné pracovní doby při provádění díla) v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčitě ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

## **XI. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz)

Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz).

2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
  - a) porušení obecně závazných předpisů,
  - b) porušení smluvních podmínek,
  - c) porušení příkazů daných objednatelem,
  - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
  - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačně příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.



6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.  
Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.
14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Zhotovitel zajistí dopracování projektové realizační dokumentace a zábor veřejného prostranství.
17. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektů.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami, a že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní zkoušky předložil před předáním staveniště ke schválení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
21. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předloží naměřené hodnoty parametrů

provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další zkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci stavby. Všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto norem.

22. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby.
23. V případě hlukového měření zajišťovaného zhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko od HSHMP.
24. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDS dané akce.
25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
26. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

## **XII. Pojištění**

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **10 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

## **XIII. Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Položkový rozpočet
- Seznam poddodavatelů
- Smlouva o budoucí spolupráci
- Plán dopravní trasy s detailním rozpisem časů a průměrné rychlosti vozidla přepravujícího požadovanou asfaltovou směs na stavenišťě
- Hospodaření s vybouraným materiálem
- Tabulka aktivace HIM

17. 01. 2020

V Praze dne .....

V Praze dne .....

**objednatel**

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

**zhotovitel**

STRABAG a.s.

.....  
Mgr. Jozef Šimčák

.....  
Ing. Michael Procházka  
na základě plné moci

.....  
Filip Hájek  
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

.....  
Ing. Jan Černý  
na základě plné moci

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(134)

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00  
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c ň u j e**

své zaměstnance

**Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Plzeň - technický vedoucí oblasti****Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti****Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 6.1.2020

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(123)

Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**

Ing. Jan Černý  
technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka  
ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Morav  
vedoucí OTÚ oblasti

PRÍLOHA E1


STRABAG a.s.  
Na Babě 106/21  
150 00 Praha 5  
IČ: 60838744

### ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

STRABAG

## "Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2"

NA ZAKÁZCE:

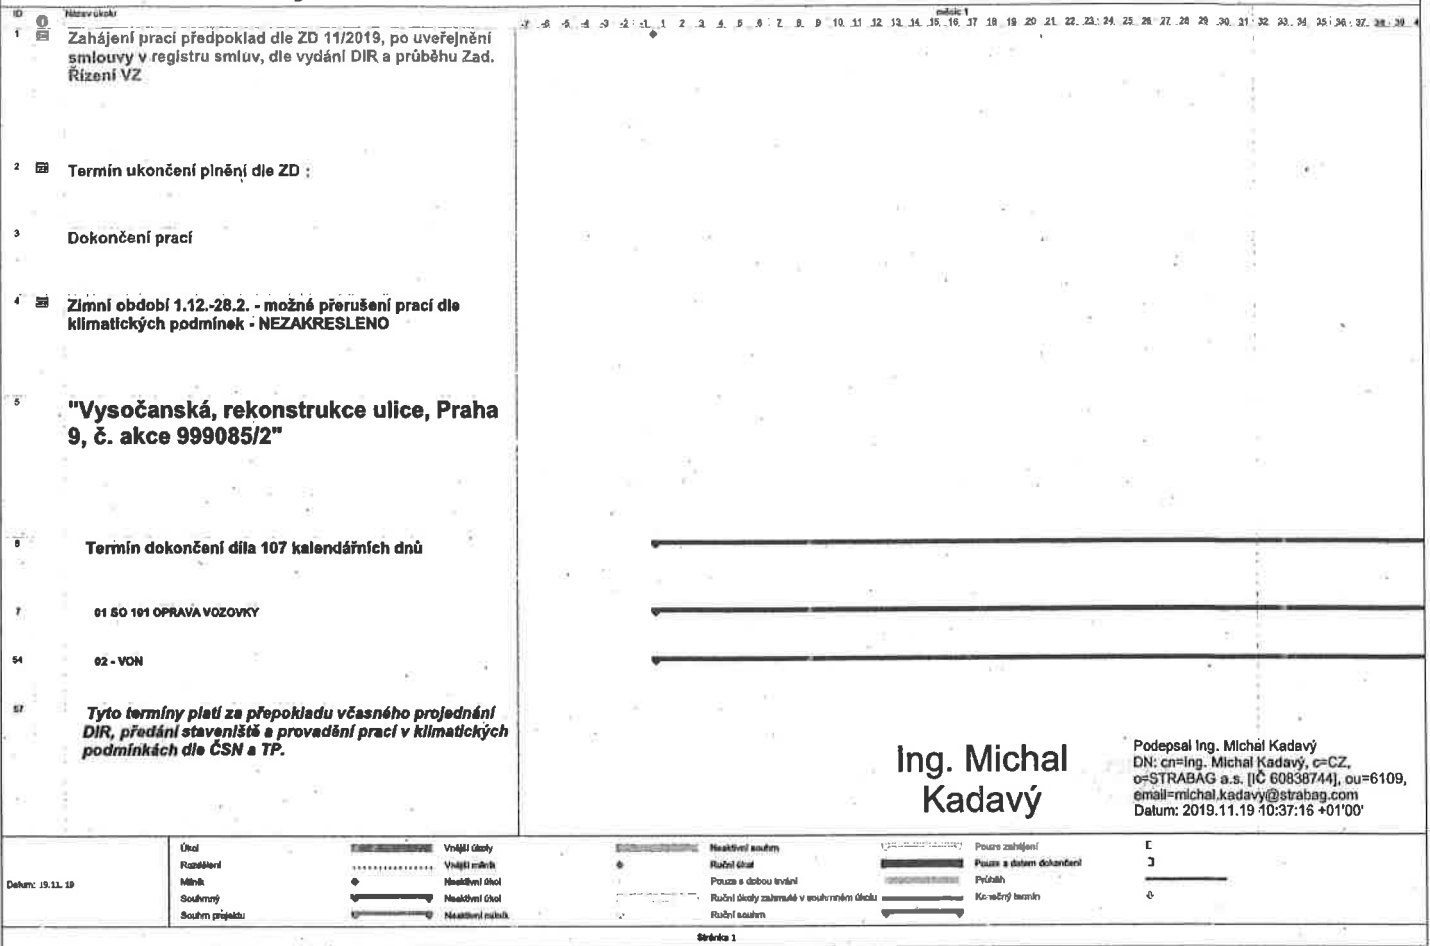


STRABAG a.s.  
Na Babě 106/21  
150 00 Praha 5  
IČ: 60838744

### ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

STRABAG

## "Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2"

NA ZAKÁZCE:

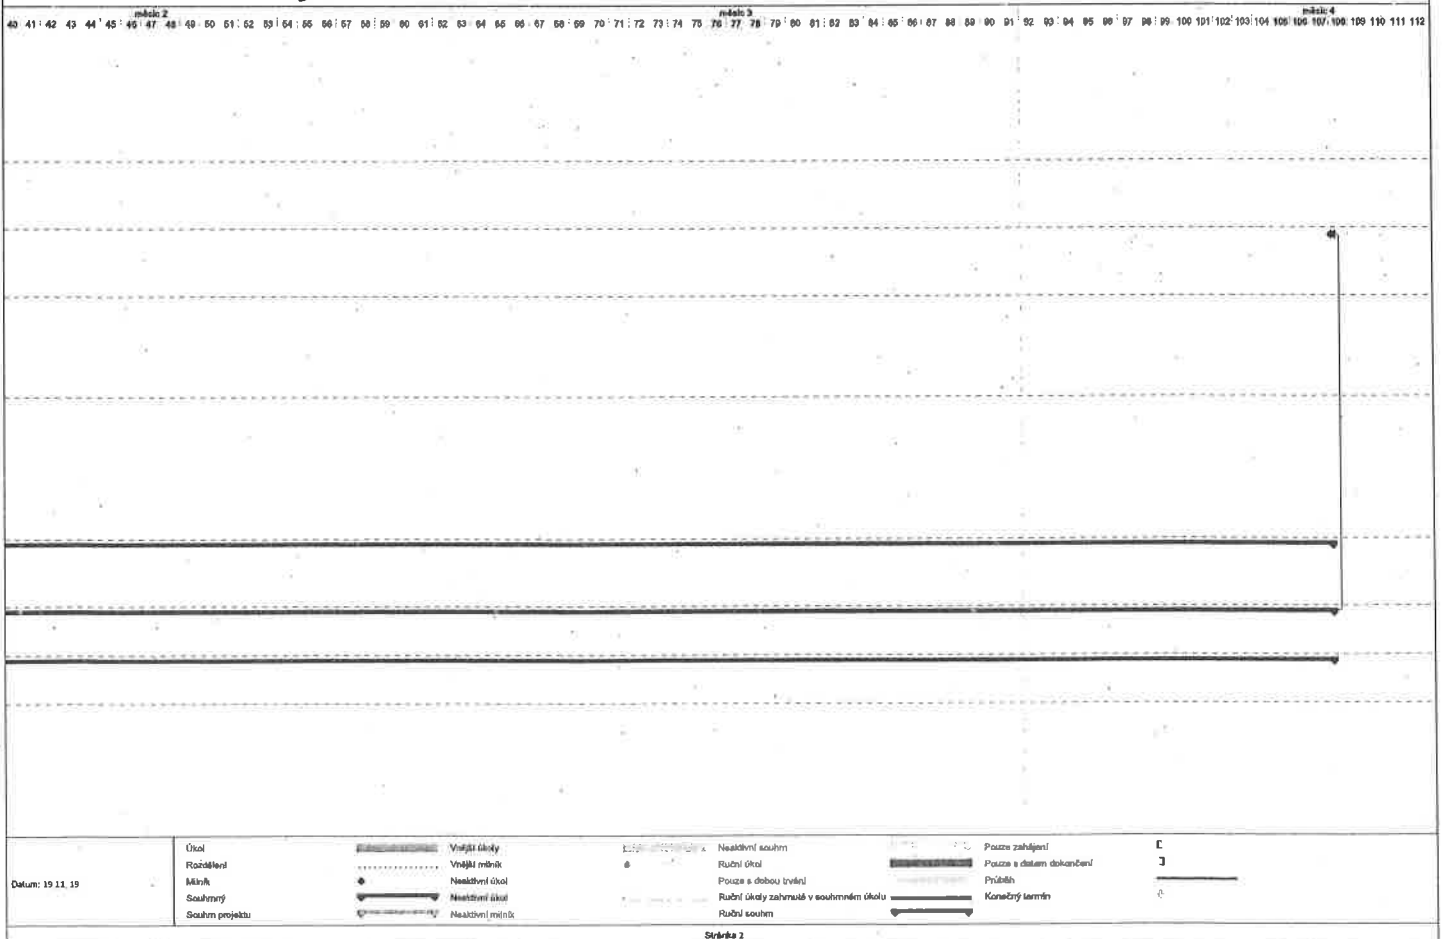

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 999085  
 Stavba: **Vysočanská, oprava havarijního stavu v úseku Na Jetelce - Nad Krocínkou**

KSO: 822 25 42  
 Místo: Praha 9  
 CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 21121  
 Datum: 11.11.2019  
 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:  
 Technická správa komunikací hl. m. Prahy

IČ: 03447286  
 DIČ: CZ03447286

Uchazeč:  
 STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744  
 DIČ: CZ60838744

Projektant:  
 KO-KA s.r.o.

IČ: 25117297  
 DIČ: CZ25117297

Zpracovatel:  
 KO-KA s.r.o.

IČ: 25117297  
 DIČ: CZ25117297

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 950 611,43</b>
	<b>Sezba daně</b>	<b>Základ daně</b>		<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	30 950 611,43		6 499 628,40
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>37 450 239,83</b>

Ing.  
 Michal  
 Kadavý

Podpis Ing. Michal Kadavý  
 IČ: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 Datum: 2019.11.11 11:00:00

Strana 1 z 40

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 999085  
 Stavba: **Vysočanská, oprava havarijního stavu v úseku Na Jetelce - Nad Krocínkou**

Místo: **Praha 9** Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy Projektant: KO-KA s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice Zpracovatel: KO-KA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>30 950 611,43</b>	<b>37 450 239,83</b>	
01	SO 101 OPRAVA VOZOVKY	28 147 099,13	34 057 989,95	STA
02	VON	2 803 512,30	3 392 249,88	VON

Strana 2 z 40

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská, oprava havarijního stavu v úseku Na Jetelce - Nad Krocínkou

Objekt:

01 - SO 101 OPRAVA VOZOVKY

KSO: 822 25 42

Místo: Praha 9

CC-CZ:

Datum: 11.11.2019

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

KO-KA s.r.o.

IČ: 25117297

DIČ: CZ25117297

Zpracovatel:

KO-KA s.r.o.

IČ: 25117297

DIČ: CZ25117297

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 147 099,13</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	28 147 099,13	21,00%	5 910 890,82	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>34 057 989,95</b>

Strana 3 z 40

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská, oprava havarijního stavu v úseku Na Jetelce - Nad Krocínkou

Objekt:

01 - SO 101 OPRAVA VOZOVKY

Místo: Praha 9

Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Projektant: KO-KA s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: KO-KA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>28 147 099,13</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>28 040 983,61</b>
1 - Zemní práce	4 929 086,40
2 - Zakládání	141 562,57
4 - Vodorovné konstrukce	5 505,37
5 - Komunikace	16 154 969,86
8 - Trubní vedení	379 138,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 794 531,79
997 - Přesun sutě	2 603 237,73
998 - Přesun hmot	32 951,74
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>106 115,52</b>
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	106 115,52

Strana 4 z 40

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská, oprava havarijního stavu v úseku Na Jetelce - Nad Krocínkou

Objekt:

02 - VON

KSO: 822 25 42

Místo: Praha 9

CC-CZ:

Datum: 11.11.2019

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

KO-KA s.r.o.

IČ: 25117297

DIČ: CZ25117297

Zpracovatel:

KO-KA s.r.o.

IČ: 25117297

DIČ: CZ25117297

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 803 512,30</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		2 803 512,30	21,00%	588 737,58
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>3 392 249,88</b>

Strana 33 z 40

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská, oprava havarijního stavu v úseku Na Jetelce - Nad Krocínkou

Objekt:

02 - VON

Místo: Praha 9

Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Projektant: KO-KA s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: KO-KA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>2 803 512,30</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>2 803 512,30</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 050 973,23
VRN3 - Zařízení staveníště	1 212 355,46
VRN4 - Inženýrská činnost	404 338,94
VRN7 - Provozní vlivy	135 844,67



## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	H	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum výkonového exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	M	Klasifikace produkce podle číselnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IC	N	IC zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámková	N	Poznámková k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objekt, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

### Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené odfiltrováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavy Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. "zhotovitel") se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, ližerýnských objektů, provozních souborů, veřejných a ostatních nákladů a ostatních nákladů a rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt ližerýnský
PRO	Provozní soubor
VON	Veřejný a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kříd list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Kříd list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případy jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, nájemného objektu, provozního souboru, veřejných a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Přebírané číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznamánka k souboru cen, P - poznamánka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
AJ	Název jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiálů a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součet množství a J.ceny
Cenové soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky	Poznamánka k souboru cen a poznamánka zadavatele
Výkaz výměr	

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

### Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editační údaje pole jsou významněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nemají být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvené pole:

- Pole Uchazeč - sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IC a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IC a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v polí
- Pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznamánka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
- Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiálů a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

### Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSabzdPH	zakládací snížená nulová základní přenesená sníž. přenesená	Zakládací sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená
eCTypZakazky	STA PRO ING YON OST	Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady
eCTypPolozky	1 2 3 4	Položka typu ISV Položka typu PSY Položka typu M Položka typu OST

### Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 * 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 * 120
Místo	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPA	N	Společný slavník pro veřejné zakázky	String	20
Místo	N	Klasifikace produkce podle číselní	String	20
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Prozámka	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Sazba DPH	M	Prozámka k soupisu prací	String	50
Základna DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	String	50
Hodnota DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	235
Cena bez DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena s DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

### Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krychoho listu soupisu	String	20 * 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krychoho listu soupisu	String	20 * 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Cena celkem	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 * 100
	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

### Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 * 120
Soupis	A	Přebírá se z Krychoho listu soupisu	String	20 * 120
Místo	N	Přebírá se z Krychoho listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krychoho listu soupisu	Date	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Krychoho listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krychoho listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krychoho listu soupisu	String	50
PC	A	Peřadové číslo položky soupisu	String	50
Typ	A	Typ položky soupisu	Long	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vylíčená jako J.Cena * Množství	Double	
Černá souprava	N	Zarazení položky do cenové soustavy	String	50
P	N	Prozámka položky ze soupisu	Memo	
PKC	N	Prozámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
PP	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSabzdPH	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(SEZNAM PODDODAVATELŮ VČ. IDENTIFIKAČNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ)




Účastník / dodavatel společnost STRABAG a.s., se sídlem Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, zastoupená zmocněnými osobami Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti, a Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti, jako dodavatel podávající nabídku na zhotovení zakázky s názvem „Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2“ jejímž zadavatelem je Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s., se sídlem Rásovkova 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 03447286, tímto

tímto předkládá soupis případných poddodavatelů, kteří se budou účastnit případné výstavby (pro STRABAG a.s.) výše uvedené stavby a dále čestně prohlašuje, že níže uvedené informace jsou pravdivé

Seznam poddodavatelů		
veřejná zakázka s názvem	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel (předmět plnění jednotlivých subdodavatelů)	% podíl na plnění VZ
„Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2“		


Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ / DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail / web:	<b>SAT, s.r.o.</b> Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 494 51 251 / CZ 494 51 251 Ing. Karel Secký, Radek Kudlička - jednatel společnosti vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86500 +420 417 569 443 / +420 417 579 514 / +420 602 429 359 katerina.kucerova@sat-roads.com / http://www.sat-roads.cz	frézování, příp. vápnění	1,9%
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ / DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail / web:	<b>PROZNAK Praha, s.r.o.</b> Plkovičká 244/17, Braník, 147 00 Praha 4 271 66 392 / DIČ: CZ27166392 Tomáš Kalkus - jednatel společnosti vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101345 +420 244 466 444 / +420 244 464 748 / +420 777 215 216 proznak@proznak.cz / http://www.proznak.cz	dopravní značení (VDZ, příp. SDZ), DIO, apod.	2,8%
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ / DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail / web:	<b>MANABAU s.r.o.</b> V Zákopech 534/3, Pilsnice, 142 00 Praha 4 02716828 / CZ02716828 Ing. Michal Naidr, Ing. Jiří Zdeněk - jednatel společnosti vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222618 +420 733 128 404 / +420 211 152 624 kendera@manabau.cz / http://www.manabau.cz	část prací na kanalizacích	3,2%
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ / DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail / web:	<b>Realizace zelené Dřevčice s.r.o.</b> Dřevčice č.p.125, 250 01 Dřevčice 02452901 / CZ02452901 Lukáš Rajtr - jednatel společnosti vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219208 +420 727 958 127 / — / +420 608 927 158 info@realizacezeleny.cz / http://www.realizacezeleny.cz	vegetační práce	0,3%

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PODDODAVATEL CEJKA 	P.2 .....%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
IČ / DIČ:		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:		
Spisová značka v obchodním rejstříku:		
Tel./fax:		
E-mail / web:		

Účastník také čestně prohlašuje, že jakákoliv změna poddodavatele bude odsouhlasena zadavatelem a musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. Na vyzvání zadavatele účastník / dodavatel doloží kvalifikaci poddodavatelů.

Toto prohlášení činíme na základě svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.


V Praze dne: 19. 11. 2019

  
 Ing. Jan Cejný  
 v plné moci  
 STRABAG a.s.

razítko: .....

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60638744  
 (123)

  
 Ing. Michael Procházka  
 v plné moci  
 STRABAG a.s.

Ing. Michal Kadavý

Podepsal Ing. Michal Kadavý  
 DN: cn=Ing. Michal Kadavý, c=CZ, o=STRABAG a.s. [IČ 60638744], ou=6109, email=michal.kadavy@strabag.com  
 Datum: 2019.11.19 11:34:02 +0100

Číslo smlouvy budoucího kupujícího: .....  
Číslo smlouvy budoucího prodávajícího: ..... 32/2019.....

## SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY

- Budoucí kupující: STRABAG a.s.**  
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, 158 00  
zápis v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ 608 38 744  
bankovní spojení: ČSOB a.s. účet: 112071233/0300  
oprávněn k jednání: Ing. Jan Černý, v plné moci  
Ing. Michael Procházka, v plné moci

(dále jen „budoucí kupující“)

- Budoucí prodávající: Společné obalovny, s.r.o.**  
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, 100 00  
zápis v Obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89505  
IČ: 267 20 825  
DIČ: CZ267 20 825  
bankovní spojení:  
oprávněn k jednání: Ing. Petr Beran, Ing. Aleš Friedrich, Marek Kebrt, Jan Vaculík,  
jednatelé

(dále jen „budoucí prodávající“)

uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### smlouvu o uzavření budoucí smlouvy:

#### I.

#### Úvodní ujednání

- Budoucí kupující je oprávněn vyzvat v případě získané „**Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2**“ budoucího prodávajícího k uzavření smlouvy o dodávce asfaltových směsí.
- Budoucí prodávající potvrzuje, že vlastní obalovny, příslušné vybavení, personál a oprávnění potřebná k výrobě asfaltových směsí v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP), Technickými podmínkami (TP), ČSN a dalšími předpisy. Budoucí prodávající též potvrzuje, že je držitelem Certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

#### II.

#### Předmět smlouvy

- V případě, že budoucí kupující uzavře se zadavatelem *Smlouvu o dílo* na zakázku definovanou v čl. I bodě 1 této smlouvy, budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím na jeho písemnou výzvu ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy budoucímu prodávajícímu Kupní smlouvu s podstatnými

náležitostmi blíže specifikovanými v článku III. této smlouvy, v rámci které bude budoucí kupující označen jako "kupující" a budoucí prodávající jako "prodávající".

### III.

#### Náležitosti budoucí smlouvy

##### 1. Předmět smlouvy.

- 1.1. Budoucí prodávající se zavazuje provést pro budoucího kupujícího dodávky asfaltových směsí pro zakázku definovanou v čl. I bodě 1 této smlouvy v plném rozsahu a požadované kvalitě.
- 1.2. **Dodávka bude realizována z obalovny Běchovice s výkonem (dle požadavku zadavatele VZ) min. 120 t/hod (typ zařízení WIBAU WKM 200, výkon – výrobní kapacita max. 240t/hod, na adrese: Mladých Běchovic 1911, 190 11 Praha 9 – Běchovice, okres Praha), vzdálenost od místa plnění do max. 40 km ( ve skutečnosti do 20 km, tj. do cca 20 minut ), kterou budoucí prodávající vlastní a provozuje a splňují celkovou vzdálenost od místa plnění (obalovna vzdálená v limitu pro dodržení ČSN a TKP). Dodávka bude splňovat požadavky obecně závazných předpisů a technických norem (TKP) platných v době podepsání smlouvy**

##### 2. Cena díla a platební podmínky.

- 2.1. Cena dodávek bude pevná a bude odvozena od jednotkových cen z nabídkové ceny budoucího prodávajícího předané budoucímu kupujícímu podle soupisu stavebních prací z projektové dokumentace.
- 2.2. Splatnost faktur bude 21 dní.

##### 3. Doba provádění díla

- 3.1. Budoucí prodávající je povinen provádět dodávky v termínech a dle harmonogramu stanoveného ve smlouvě o dílo uzavřené mezi kupujícím a zadavatelem.
- 3.2. Budoucí prodávající je přitom povinen respektovat návaznost dalších souvisejících prací a činností při realizaci zakázky jako celku.
- 3.3. Budoucí kupující je povinen respektovat možnosti výrobních kapacit prodávajícího.
- 3.4. **Předpokládaná lhůta výstavby: v období cca 11/2019 – 12/2020, příp. přesněji dle DIR.**

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
2. Tato smlouva se ruší v případě, že nabídka, předložená budoucím kupujícím v zadávacím řízení vyhlášeném na zakázku „**Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2**“ nebude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější a zadavatel neuzavře s budoucím kupujícím smlouvu o dílo na realizaci zakázky.
3. Výzva budoucího kupujícího k uzavření budoucí smlouvy o dílo se považuje za doručenou také uplynutím lhůty 3 dnů ode dne prokazatelného odeslání budoucímu prodávajícímu.

4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, majících povahu originálu, přičemž budoucí kupující obdrží 2 vyhotovení a budoucí prodávající 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne: *19. 11. 2019*  
budoucí kupující  
za STRABAG a.s.

V Praze..... dne: 31.10.2019  
budoucí prodávající  
za Společné obalovny, s.r.o.

*[Signature]*  
.....  
Ing. Jan Černý  
v plné moci  
STRABAG a.s.

*[Signature]*  
.....  
Marek Kebrt, jednatel

*[Signature]*  
.....  
Ing. Michael Procházka  
v plné moci  
STRABAG a.s.

*[Signature]*  
.....  
Ing. Petr Beran, jednatel

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(123)

Praha 10, Outěšská 3226, PSČ 100 00  
Tel: 267 226 113, Fax: 267 226 601  
IČ: 26720225

**Společné obalovny, s.r.o.**

Ing. Michal  
Kadavý

Podepsal Ing. Michal Kadavý  
DN: cn=Ing. Michal Kadavý, c=CZ,  
o=STRABAG a.s. [IČ 60838744], ou=6109,  
email=michal.kadavy@strabag.com  
Datum: 2019.11.19 10:48:31 +01'00'

# ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB NA DODÁVKU OBALOVANÝCH SMĚSÍ

pro stavbu:

## „Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2“

Potvrzujeme odběrateli obalovaných směsí:

**STRABAG a.s.** IČ:608 38 744, DIČ: CZ60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, zastoupená Ing. Jan Černý, v plné moci a Ing. Michael Procházka, v plné moci, vedená v OR Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634,

že jako dodavatel (tj. obalovna): obalovna Běchovice

Firma: **Společné obalovny, s.r.o.**

Sídlo: Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

poskytneme živичné směsi v množství nutném pro řádné provedení příslušných prací na výše uvedené stavbu.

Dodávka bude uskutečněna v období : **předpoklad v období 11/2019 – 12/2020.**

V Praze:

Dne: ...31.10.2019

.....

Ing. Petr Beran, jednatel

.....

Marek Kebrt, jednatel

Tržba 10 Dubečská 3238 100 00 Praha 10  
Tel.: 257 221 110 Fax: 257 126 001  
IČ: 257 0825  
Společné obalovny, s.r.o.



**Čestné prohlášení  
o splnění základních kvalifikačních předpokladů  
podle § 74 odst. 1 zákona**

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené v užším zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem:

**„Vysočanská, rekonstrukce ulice,  
Praha 9, č. akce 999085/2“**

Čestně prohlašuji, že společnost Společné obalovny, s.r.o., dodavatel asfaltových směsí pro účastníka STRABAG a.s. v ZŘ na veřejnou zakázku výše uvedenou, splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 74 odst. 1 dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):


- 1) § 74 odst. 1 písm. a)  
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- 2) § 74 odst. 1 písm. b)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- 3) § 74 odst. 1 písm. c)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- 4) d § 74 odst. 1 písm. d)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- 5) § 74 odst. 1 písm. e)  
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V případě požadavku zadavatele společnost Společné obalovny, s.r.o. doloží další požadované doklady.

V Praze dne: 31. 10. 2019




Ing. Petr Beran  
jednatel společnosti  
Společné obalovny, s.r.o.



Marek Kebrt  
jednatel společnosti  
Společné obalovny, s.r.o.

PLÁN DOPRAVNÍ TRASY S UVEDENÍM VZDÁLENOSTI K MÍSTU PLNĚNÍ VZ V KM VČETNĚ UVEDENÍ ČASU A PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI VOZIDLA PŘEPRAVUJÍCÍHO POŽADOVANOU ASFALTOVOU SMĚS NA STAVENIŠTĚ.

TRASA = 11,6 KM, ČAS DOJEZDU CCA 16 MIN, PRŮMĚRNÁ RYCHLOST = 60 KM/HOD.

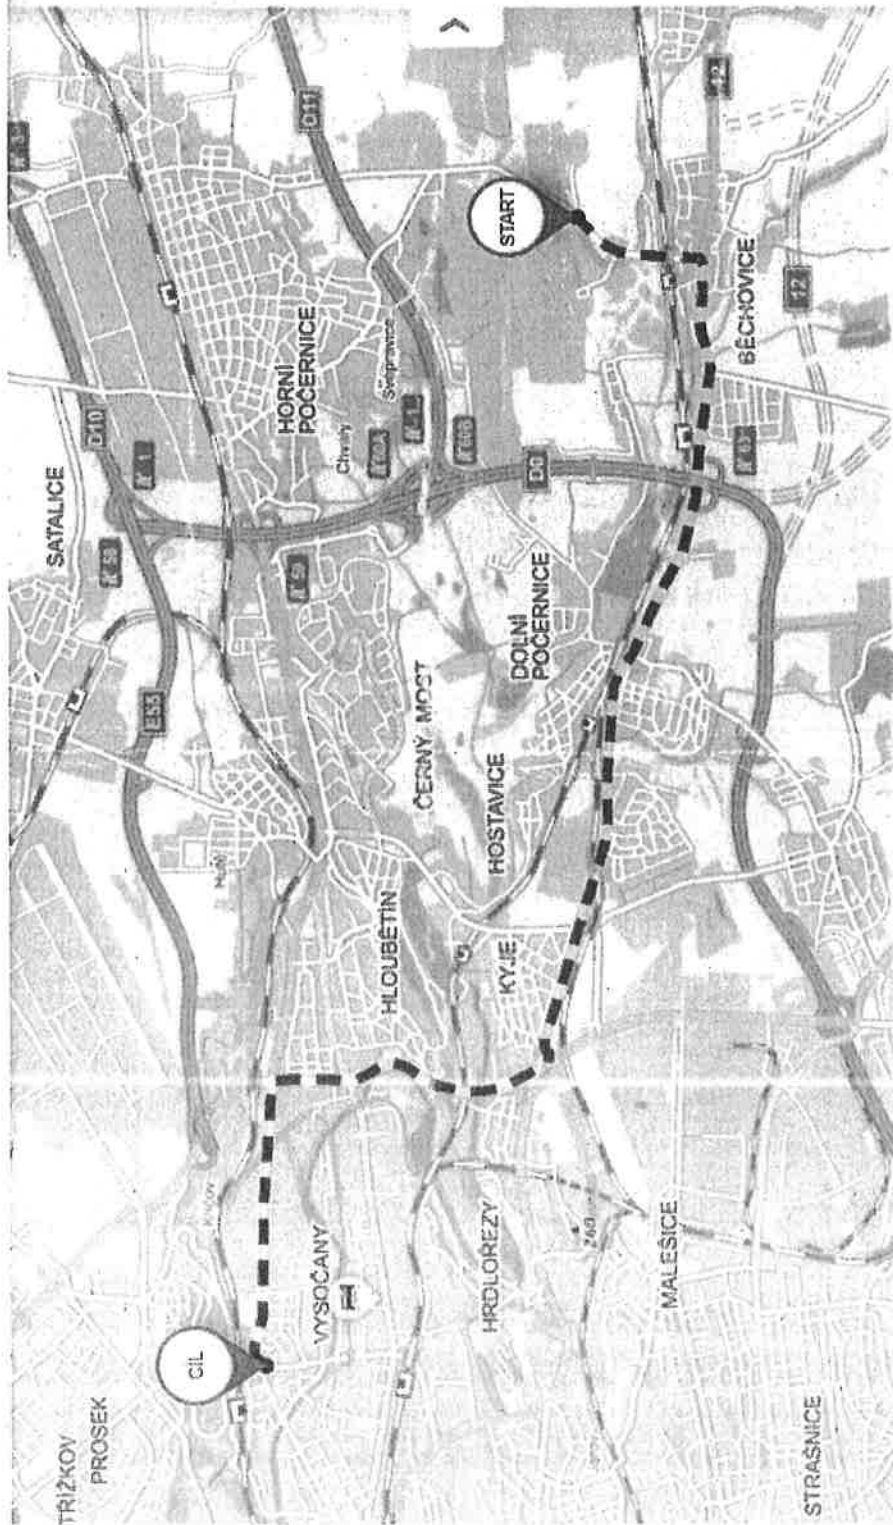

Rychlá Krátká Vyhnut se placeným úsek

Trasa 11,6 km – 16 min

★ Uložít  
🗺️ Sdílet  
📄 Exportovat

75 m 118 m

249 m n m

201 m n m

2,9 km

5,8 km

8,7 km

Itinerář

MILLOTTA 2.0

Podepsal Ing. Michal Kadavý  
DN: cn=Ing. Michal Kadavý, c=CZ, o=STRABAG a.s, jic  
608387443, ou=6108, email=michal.kadavy@strabag.com  
Datum: 2019.12.16 13:50:41 +0100

Ing. Michal Kadavý

Hospodaření s vybouraným materiálem  
- základní podmínky postupu dodavatele

- 1) Dodavatel a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
  - po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
  - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
  - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90 % výtěžnosti, tj. 10 % ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz. bod 1),
  - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jim být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním čísle 241 471 148 – sklad a 257 015 748.

## PŘÍLOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění podle čísel objektů:

**Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně.** Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

**a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku – (předat kopii znaleckého posudku)**

**b) Hodnota komunikace**

- b.1.) vozovka
  - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
  - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
  - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/
  - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m2 a dopravněbezpečnostní zařízení
- b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
- b.3.) demolice
- b.4.) chráničky
- b.5.) komunikační zeleň
- b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
- b.7.) schodiště
- b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)\*\*\*

**c) Tunely (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)**

**d) Mosty (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)**

**e) Speciální objekty** (pítka, nadzemní garáže,...),  
P+R,  
odtahy a vážení,  
zařízení pro zimní službu,  
zařízení pro přenosy dat

**f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/**

**g) Zdi**

**h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ**

**i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic**

**j) Objekty pro telematiku**

\*\*\* tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.
