

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/054

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2136-841/TC/21/18/12

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, členem představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDI

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 112071233/0300

zastoupená: Ing. Michael Procházka, na základě plné moci

Ing. Jan Černý, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
tel.: 602 316 311, e-mail: michael.prochazka@strabag.com

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
tel.: 602 380 339, e-mail: jan.cerny@strabag.com

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát (vedoucí PJ)
tel.: 724 861 792, e-mail: martin.pilat@strabag.com

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Nuselská III. etapa, Praha 4, č. akce 999055/3“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4.

Dílo je vymezeno následovně:

V rámci stavby III. etapy dojde k rekonstrukci ul. Nuselská v délce cca 426 m, v úseku most přes Botič - Michelská. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace (vozovka s živičným krytem, chodníky mozaiková dlažba, chodníkové přejezdy, autobusové zastávky a parkovací stání z dlažební kostky velké a vegetační úpravy.

Přeložku České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále jen „CETIN“), která je součástí stavby, zajišťuje pro zadavatele CETIN.

Součástí předmětu plnění je:

- zajištění DIR,
- projekt a realizace DIO,
- měření hladiny hluku před a po stavbě dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.
(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 4, ul. Nuselská, úsek most přes Botič - Michelská
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a ve stanovené době je předat objednateli v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou a objednatelem ze dne 12. 1. 2017 o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP, a realizační objednávky akce ze strany hl. m. Prahy. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, předpoklad: 03/2019,

Dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo a termíny správního řízení, nestanoví-li objednatel pozdější termín.

2. Termín dokončení: **max. do 189 kalendářních dnů od zahájení prací**

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: **189 kalendářních dnů**

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

Z důvodů klimatických podmínek a koordinací může dojít k přerušení stavebních prací. Přerušení bude stanoveno zápisem ve stavebním deníku, potvrzeno zástupcem objednatele a zhotovitele bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. Doba tohoto přerušení se nebude započítávat do lhůty výstavby.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.

Zhotovitel se zavazuje, že stavbu bude koordinovat s akcemi Pražské plynárenské, a.s., UPC Česká republika, s.r.o., CETIN, MHMP VO, T-Mobile, DPP a.s., které budou se stavbou místně a časově souviset.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

2. **Celkem cena za dílo bez DPH : 37 193 815,27 Kč**

DPH : 7 810 701,21 Kč

Cena celkem včetně DPH : 45 004 516,48 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojnásobném vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přejímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě

4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.

2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím

protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.
7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
3. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a

budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umístování těchto informačních tabulí.

4. Zhotovitel prohlašuje, že

je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné zakázky v době jejího plnění, neboť má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky, což dokládá smlouvou o budoucí spolupráci, přičemž tuto smlouvu o budoucí spolupráci přikládá jako přílohu k této smlouvě.

5. Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl.VI. odst.4. této smlouvy zhotovitel dokládá plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na stavenišťe zpracovaný v souladu s čl. 6.4 zadávací dokumentace.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII.

Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK).
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - geometrické plány
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítíZhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na **60 měsíců (na stavební část). 36 měsíců (vodorovné DZ)**.
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.
5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nepochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce

sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavatelé neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.
14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Zhotovitel zajistí dopracování projektové realizační dokumentace a zábor veřejného prostranství.
17. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektů.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní zkoušky předložil před podpisem smlouvy ke schválení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předloží naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další zkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadávací

dokumentaci stavby. Všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto norem.

21. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby.
22. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce.
23. V případě hlukového měření zajišťovaného zhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko od HSHMP.
24. Zhotovitel se zavazuje, že při výsadbě keřů a stromů zajistí následnou péči po dobu záruky.
25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
26. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **10 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran

4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webovských stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Podrobný harmonogram prací
 - Položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů
 - Smlouva o budoucí spolupráci (obalovna)
 - Plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště
 - Hospodaření s vybouraným materiálem
 - Tabulka aktivace HIM

V Praze dne18. 06. 2018

V Praze dne

objednatel

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

.....

Ing. Jiří Tumpach, MBA

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

zhotovitel

STRABAG a.s.




.....
Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

.....
Ing. Jan Černý
na základě plné moci



STRABAG a.s.
Na Šéllále 198/21, 150 00 Praha 5
(83)

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
NA ZAKÁZCE
Nuselská III. etapa, Praha 4, č. akce 999055/3

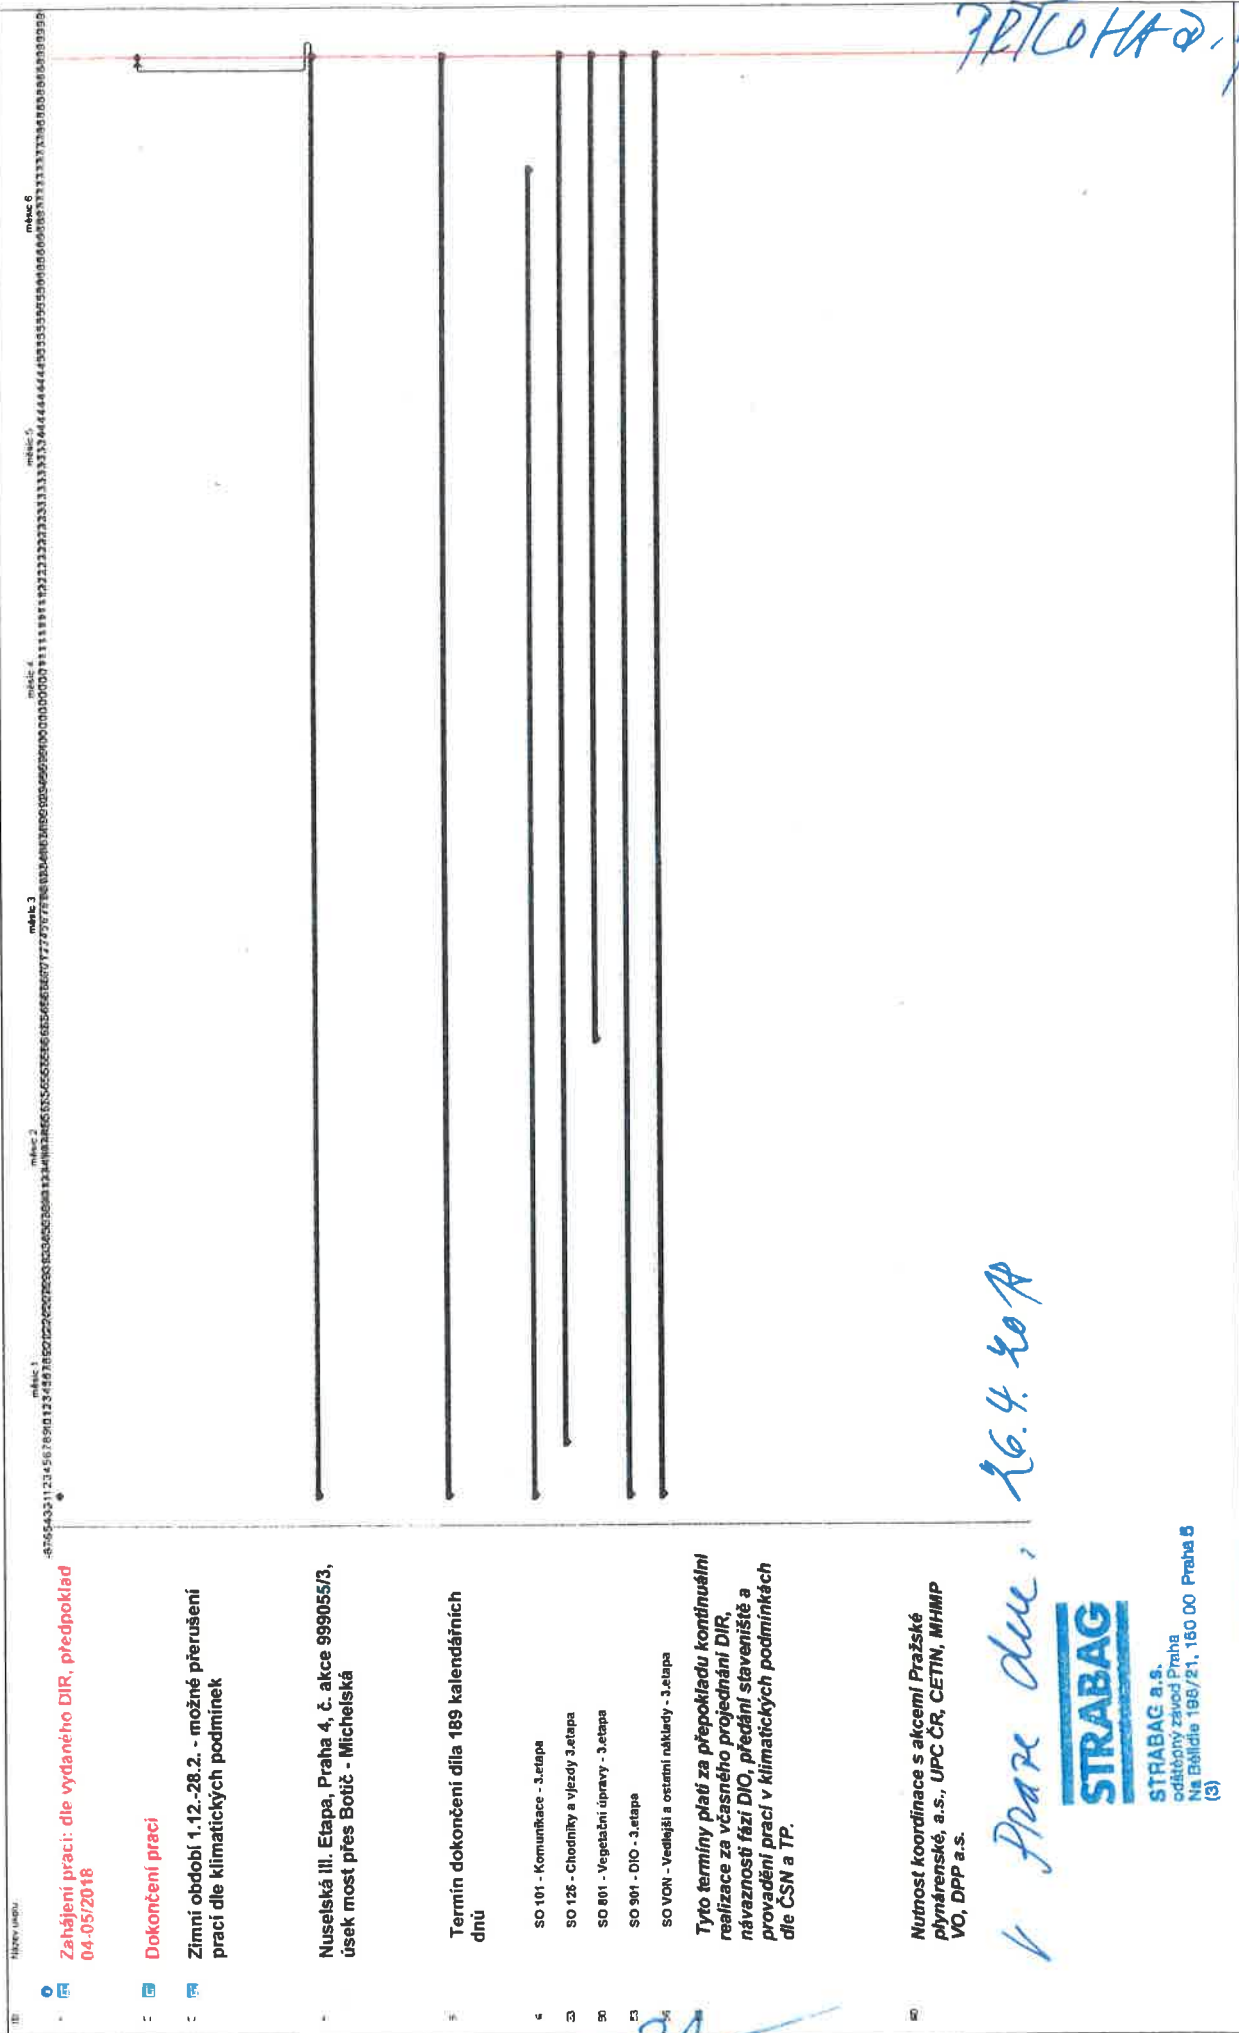

7. P. COHA

26.4.2018

v Praze dne,



STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 188/21, 160 00 Praha 5
(3)

Ukol: _____
 Rozhodn: _____
 Měník: _____
 Soumry: _____

Soumry projektu: []
 Vnější úkony: []
 Vnější nárok: []
 Neaktívni úkol: []

Neaktivní úkol: []
 Neaktivní měník: []
 Neaktivní soumry: []
 Rubní úkol: []

Pouze s dobou tváře: []
 Rubní úkol zahrnuté v souhrnném úkolu: []
 Rubní soumry: []
 Pouze zhlášení: []

Pouze s dalším odobřeni: []
 Problém: []
 Konečný termín: []

Číslo: 27 4 18

Stránka 1

PRÍLOHA č. 2

STRABAG

CELKOVÁ REKAPITULACE

NA ZAKÁZKU

"Nuselská III. etapa, Praha 4, č. akce 999055/3"

NABÍDKOVÁ CENA (V Kč):	
Cena bez DPH:	27.192.815,27 Kč
DPH (21%):	7.810.701,21 Kč
Cena vč. DPH:	45.004.516,48 Kč
LHŮTA VÝSTAVBY (VE DNECH):	
189 KALENDÁRNÍCH DNÍ	
DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY (V MĚSÍCÍCH):	
60 MĚSÍCŮ NA VSTAVEBNÍ ČÁST 36 MĚSÍCŮ NA VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	

V Praze dne 26. 4. 2018

Ing. Jan Černý
v plné moci

STRABAG

STRABAG s. s. s.
odštěpný závod Praha
Na Bálčle 198/21, 160 00 Praha 6
(3)

Ing. Michael Procházka
v plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Nuselska-3etapa
Stavba: Nuselská, Praha 4, č.akce 999055

KSO: CC-CZ: 27.5.2017
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Poznámka:

Cena bez DPH 37 193 815,27

DPH základní 21,00%
DPH snížená 15,00%
Základ daně 37 193 815,27
Výše daně 7 810 701,21
0,00

Cena s DPH 45 004 516,48

v CZK



STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nuselska-3etapa

Stavba: Nuselská, Praha 4, č.akce 999055

Místo: Datum: 27.05.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	SO 101 - Komunikace - 3.etapa	19 594 370,96	23 709 188,86	STA
SO 101	SO 101 - Komunikace - 3.etapa	19 594 370,96	23 709 188,86	Soupis
SO 125	SO 125 - Chodníky a vjezdy 3.etapa	11 436 230,25	13 837 838,60	STA
SO 125	SO 125 - Chodníky a vjezdy 3.etapa	11 436 230,25	13 837 838,60	Soupis
SO 801	SO 801 - Vegetační úpravy - 3.etapa	511 268,93	618 635,41	STA
SO 801	SO 801 - Vegetační úpravy - 3.etapa	511 268,93	618 635,41	Soupis
SO 901	SO 901 - DIO - 3.etapa	2 197 682,72	2 659 196,09	STA
SO 901	SO 901 - DIO - 3.etapa	2 197 682,72	2 659 196,09	Soupis
SO VON	SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - 3.etapa	3 454 262,41	4 179 657,52	STA
SO VON	SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - 3.etapa	3 454 262,41	4 179 657,52	Soupis




STRABAG a. s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(SEZNAM PODDODAVATELŮ VČ. IDENTIFIKAČNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ)

STRABAG

Účastník / dodavatel společnost **STRABAG a.s.**, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, zastoupená zplnomocněnými osobami Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti, a Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti, jako dodavatel podávající nabídku na zhotovení zakázky s názvem **"Nuselská III. etapa, Praha 4, č. akce 999055/3"** jejímž zadavatelem je Technická správa komunikací hl.m. Prahy a.s., se sídlem Řásovkova 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 03447286, zastoupené Ing. Petrem Smolkou, generální ředitel a předseda představenstva a dále Ing. Jirím Trávníčkem, náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva, tímto

tímto předkládá soupis případných poddodavatelů, kteří se budou účastnit případné výstavby (pro STRABAG a.s.) výše uvedené stavby a dále čestně prohlašuje, že níže uvedené informace jsou pravdivé

Seznam poddodavatelů	
veřejná zakázka s názvem	
"Nuselská III. etapa, Praha 4, č. akce 999055/3"	
	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli (předmět plnění jednotlivých subdodavatelů)
	% podíl na plnění VZ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

PRŮLOHA 0-7

64

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PROZNAK Praha, s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo invalého pobytu:	Pikovická 244/17, Braník, 147 00 Praha 4		
IČ / DIČ:	271 66 392 / DIČ: CZ27166392		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Tomáš Kalkus - jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101345		
Tel./fax:	+420 244 466 444 / +420 244 464 748 / +420 777 215 216		
E-mail / web:	proznak@proznak.cz / http://www.proznak.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SAT s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo invalého pobytu:	Praha 5, Smíchov, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00		
IČ / DIČ:	494 51 251 / CZ 494 51 251		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Radek Kudlička, Ing. Karel Secký - jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86500		
Tel./fax:	+420 417 569 443 / +420 417 579 514 / +420 602 429 359		
E-mail / web:	radek.kudlicka@sat-roads.com / http://www.sat-roads.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ARANEANETWORK a.s.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo invalého pobytu:	Modřanská 307/98, Hodkovičky, 147 00 Praha 4		
IČ / DIČ:	241 26 039 / CZ24126039		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Peter Cekul, Miroslav Bartík, Martin Pochop - představenstvo společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17250		
Tel./fax:	+420 241 727 870 / +420 226 200 129 / +420 737 257 816		
E-mail / web:	ludvik.galuska@araneanetwork.cz / www.araneanetwork.cz		
		DIO, dopravní značení (tj. VDZ a SDZ)	46 %
		frézování (příp. lze i vápnění, apod.)	97 %
		měření optických vláken, případně elektro, aj.	14 %

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.	vegetační práce	95 %
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Dřevčice č.p.125, 250 01 Dřevčice		
IČ / DIČ:	02452901 / CZ02452901		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele / kontaktní osoba:	Lukáš Rajtr - jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219208		
Tel./fax:	+420 727 958 127 / ----- / +420 608 927 158		
E-mail / web:	info@realizacezeleny.cz / http://www.realizacezeleny.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	DAP. a.s.	část prací na dlažbách, kamen.práce	97 %
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 2, Sarajevská 1498/17, PSČ 120 00		
IČ / DIČ:	265 08 583 / CZ26508583		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele / kontaktní osoba:	Ing. Jiří Kiliinger, Petr Louda, Mgr. Petr Ondrášek - představenstvo společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7520		
Tel./fax:	+420 222 560 202 / +420 222 560 404		
E-mail / web:	dap@dap.cz / http://www.dap.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MANABAU s.r.o.	část prací na kanalizacích	77 %
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	V Zákopech 534/3, Pisnice, 142 00 Praha 4		
IČ / DIČ:	02716828 / CZ02716828		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele / kontaktní osoba:	Ing. Michal Naidr, Ing. Jiří Zdeněk - jednatelé společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222618		
Tel./fax:	+420 733 128 404 / +420 211 152 624		
E-mail / web:	kendera@manabau.cz / http://www.manabau.cz		

66



STRABAG a.š.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 196/21, 150 00 Praha 5
(3)

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PDDODAVATELE CECKEY 21,2%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
IČ / DIČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Tel./fax:	
E-mail / web:	

Uchazeč také čestně prohlašuje, že jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem a musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. Na vyzádaní zadavatele účastník / dodavatel doloží kvalifikaci poddodavatelů.

Toto prohlášení činíme na základě svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne: 26. 4. 2017

Ing. Jan Černý
 v plné moci
 STRABAG a.s.

razítko: 
 Ing. Michael Procházka
 v plné moci
 STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
 odstěpný závod Praha
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6

67

7270110 0.4

Číslo smlouvy budoucího kupujícího:
Číslo smlouvy budoucího prodávajícího: 113/2018

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY

1. **Budoucí kupující: STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zápis v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
bankovní spojení: ČSOB a.s. účet: 112071233/0300
oprávněn k jednání: Ing. Jan Černý, v plné moci
Ing. Michael Procházka, v plné moci

(dále jen „budoucí kupující“)

2. **Budoucí prodávající: Společné obalovny, s.r.o.**
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, 100 00
zápis v Obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89505
IČ: 267 20 825
DIČ: CZ267 20 825
bankovní spojení: UniCredit Bank CR and Slovakia a.s. 800838004/2700
oprávněn k jednání: Ing. Petr Beran, Ing. Aleš Friedrich, Marek Kebrt, Jan Vaculík,
jednatelé

(dále jen „budoucí prodávající“)

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy:

I.

Úvodní ujednání

1. Budoucí kupující je oprávněn vyzvat v případě získané zakázky "**Nuselská III. etapa, Praha 4, č.akce 9999055/3**" budoucího prodávajícího k uzavření smlouvy o dodávce asphaltových směsí.
2. Budoucí prodávající potvrzuje, že vlastní obalovny, příslušné vybavení, personál a oprávnění potřebná k výrobě asphaltových směsí v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP), Technickými podmínkami (TP), ČSN a dalšími předpisy. Budoucí prodávající též potvrzuje, že je držitelem Certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

II.

Předmět smlouvy

1. V případě, že budoucí kupující uzavře se zadavatelem *Smlouvu o dílo* na zakázku definovanou v čl. I bodě 1 této smlouvy, budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím na jeho písemnou výzvu ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy budoucímu prodávajícímu Kupní smlouvu s podstatnými náležitostmi blíže specifikovanými v článku III. této smlouvy, v rámci které bude budoucí kupující označen jako "kupující" a budoucí prodávající jako "prodávající".

STRABAG

STRABAG a.s.
oděpny závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

68

III. Náležitosti budoucí smlouvy

1. Předmět smlouvy.
 - 1.1. Budoucí prodávající se zavazuje provést pro budoucího kupujícího dodávky asfaltových směsí pro zakázku definovanou v čl. I bodě 1 této smlouvy v plném rozsahu a požadované kvalitě.
 - 1.2. **Dodávka bude realizována z obalovny Běchovice s výkonem (dle požadavku zadavatele VZ) min. 120 t/hod (typ zařízení WIBAU WKM 200, výkon – výrobní kapacita max. 240t/hod, na adrese: Mladých Běchovic 1911, 190 11 Praha 9 – Běchovice, okres Praha), vzdálenost od místa plnění do max. 40 km (ve skutečnosti do 22 km, tj. do cca 30 minut), kterou budoucí prodávající vlastní a provozuje a splňují celkovou vzdálenost od místa plnění (obalovna vzdálená v limitu pro dodržení ČSN a TKP). Dodávka bude splňovat požadavky obecně závazných předpisů a technických norem (TKP) platných v době podepsání smlouvy**
2. Cena díla a platební podmínky.
 - 2.1. Cena dodávek bude pevná a bude odvozena od jednotkových cen z nabídkové ceny budoucího prodávajícího předané budoucímu kupujícímu podle soupisu stavebních prací z projektové dokumentace.
 - 2.2. Splatnost faktur bude 21 dní.
3. Doba provádění díla
 - 3.1. Budoucí prodávající je povinen provádět dodávky v termínech a dle harmonogramu stanoveného ve smlouvě o dílo uzavřené mezi kupujícím a zadavatelem.
 - 3.2. Budoucí prodávající je přitom povinen respektovat návaznost dalších souvisejících prací a činností při realizaci zakázky jako celku.
 - 3.3. Budoucí kupující je povinen respektovat možnosti výrobních kapacit prodávajícího.
 - 3.4. **Předpokládána lhůta výstavby: v období cca 05/2018 – 12/2019, příp. přesněji dle DIR.**

IV. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
2. Tato smlouva se ruší v případě, že nabídka, předložená budoucím kupujícím v zadávacím řízení vyhlášeném na **"Nuselská III. etapa, Praha 4, č.akce 9999055/3"** nebude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější a zadavatel neuzavře s budoucím kupujícím smlouvu o dílo na realizaci zakázky.
3. Výzva budoucího kupujícího k uzavření budoucí smlouvy o dílo se považuje za doručenou také uplynutím lhůty 3 dnů ode dne prokazatelného odeslání budoucímu prodávajícímu.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků ke smlouvě.

STRABAG


STRABAG a.s.
oděpčný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

5. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, majících povahu originálu, přičemž budoucí kupující obdrží 2 vyhotovení a budoucí prodávající 1 vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne: *10.4. 2018*
budoucí kupující
za STRABAG a.s.

V Praze dne: 10.4.2018
budoucí prodávající
za Společné obalovny, s.r.o.


.....
Ing. Jan Černý
v plné moci
STRABAG a.s.


.....
Ing. Petr Beran
jednatel


.....
Ing. Michael Procházka
v plné moci
STRABAG a.s.


.....
Marek Kebrt
jednatel


STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidě 198/21, 160 00 Praha 6
(3)

Praha 10, Dubčická 9238, PSČ 100 00
Tel.: 267 226 111, Fax: 267 226 801
K: 26720075
-5-

Společné obalovny, s.r.o.

70


STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidě 198/21, 160 00 Praha 6
(3)

ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB NA DODÁVKU OBALOVANÝCH SMĚSÍ

pro stavbu:

"Nuselská III. etapa, Praha 4, č.akce 9999055/3"

Potvrzujeme odběrateli obalovaných směsí:

STRABAG a.s. IČ:608 38 744, DIČ: CZ60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, zastoupená Ing. Jan Černý, v plné moci a Ing. Michael Procházka, v plné moci, vedená v OR Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634,

že jako dodavatel (tj.obalovna): obalovna Běchovice

Firma: **Společné obalovny, s.r.o.**


Sídlo: Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

poskytneme živичné směsi v množství nutném pro řádné provedení příslušných prací na výše uvedenou stavbu.

Dodávka bude uskutečněna v období : **předpoklad v období 5/2018 – 12/2019.**

V Praze

Dne: 10.4.2018


.....
Ing. Petr Beran Marek Kebrt
jedenatelé

Praha 10, Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
Tel: 261 220 110, Fax: 261 220 111
IČ: 26723825
-5


Společné
obalovny, s.r.o.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

— 71 —

**Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 74 odst. 1 zákona**

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené v užším zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem:


**"Nuselská III. etapa, Praha 4, č. akce
9999055/3"**

Čestně prohlašuji, že společnost Společné obalovny, s.r.o., dodavatel asfaltových směsí pro účastníka STRABAG a.s. v ZŘ na veřejnou zakázku výše uvedenou, splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 74 odst. 1 dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

- 1) § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- 2) § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- 3) § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- 4) d § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- 5) § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V případě požadavku zadavatele společnost Společné obalovny, s.r.o. doloží další požadované doklady.

V Praze dne: 10.4.2018



Ing. Petr Beran
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.



Marek Kebrt
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.

Praha 10, Dolní částeč 3238, PSČ 101 00
Tel: +420 226 111, fax: +420 226 401
K: 26720825

-5-

Společné
obalovny, s.r.o.



74

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Břidlice 19A/21, 150 00 Praha 6
(3)



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 89505

Datum vzniku a zápisu: 21. srpna 2002

Spisová značka: C 89505 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: Společné obalovny, s.r.o.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Identifikační číslo: 267 20 825

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

Ing. ALEŠ FRIEDRICH, dat. nar. 30. dubna 1967
Polanecká 165, Václavovice, 742 83 Klimkovice
Den vzniku funkce: 1. prosince 2016

jednatel:

MAREK KEBRT, dat. nar. 25. února 1958
Oblouková 559, 252 46 Vrané nad Vltavou
Den vzniku funkce: 7. dubna 2016

jednatel:

Ing. PETR BERAN, dat. nar. 22. března 1964
Luční 923, 464 01 Frýdlant
Den vzniku funkce: 7. dubna 2016

jednatel:

JAN VACULÍK, dat. nar. 10. února 1962
č.p. 26, 687 41 Hostějov
Den vzniku funkce: 8. dubna 2015

Způsob jednání:

Jménem společnosti jednají vždy dva jednatele společnosti tak, aby každý společník byl zastoupen svým zástupcem, tj. jednatele jednají takto:
- Ing. Petr Beran spolu s Markem Kebrtem
- Ing. Petr Beran spolu s Janem Vaculíkem
- Ing. Aleš Friedrich spolu s Markem Kebrtem
Ing. Aleš Friedrich spolu s Janem Vaculíkem

Společníci:

Společník:

BOHEMIA ASFALT, s.r.o., IČ: 251 86 183
Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, okres Tábor, PSČ 39201

Podíl:

Vklad: 2 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní

Společník:

PORR a.s., IČ: 430 05 560
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Podíl:

Vklad: 2 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 6
(3)

78

Ke dni 1.10.2012 zanikl společník Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., identifikační číslo 452 73 910 fúzí sloučením s Porr(Česko) a.s., identifikační číslo 430 05 560, která je nástupnickou společností; od 1.10.2012 používá nástupnická společnost obchodní firmu Porr a.s.

Základní kapitál: 5 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Počet členů statutárního orgánu: 4

- 74

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 266/2018, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **DVOŘÁKOVÁ IRENA**

V Praze dne **03.04.2018**

Podpis




STRABAG

STRABAG a.s.
odštepňovací závod Praha
Na Bálidě 100/21, 150 00 Praha 5

(13)



KARTEL 08: NUSELSKÁ III. ETAPA, PRAHA, AKCE 999057/14

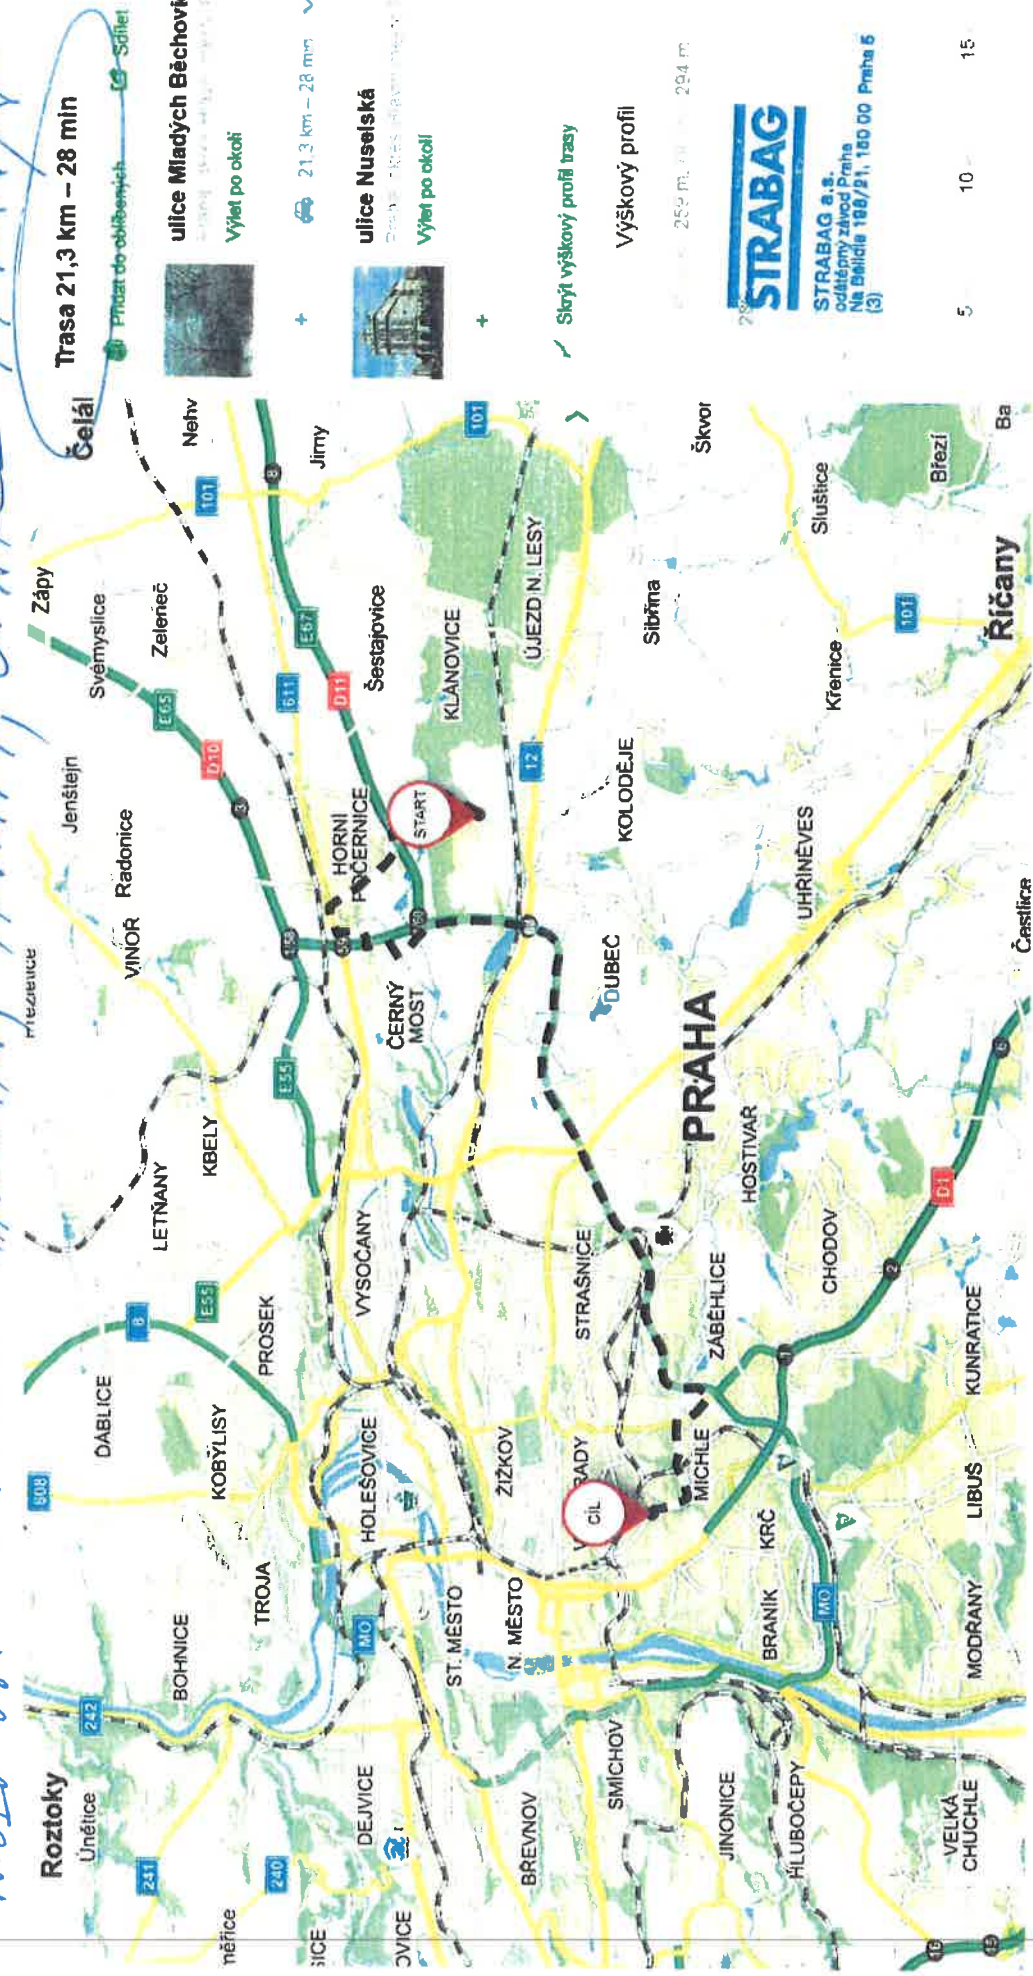

Trasa 21,3 km – 28 min
 Přístup do oblíbených Sdílet

ulice Mladých Běchovic
 Výlet po okolí

21,3 km – 28 min

ulice Nuselská
 Výlet po okolí

Skýt výškový profil trasy
 Výškový profil

STRABAG
 STRABAG a.s.
 oddělení závod Praha
 Na Běhovicích 168/51, 160 00 Praha 6
 (3)

5 10 15

PRÍLOHA D.5

PLÁN PO PRAHNI TRASY S NAVEZENITÝ VZDÁLENOST
 A PŘÍJITÝ PLNĚNÍ VŠECH PO KTERÉ ANDE
 ZAVIŠTOVAT DOPRAVATEL VŠECH DOPRAKY K PRACT. V PRACT.

Hospodaření s vybouraným materiálem
- základní podmínky postupu dodavatele

- 1) Dodavatel a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
 - po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
 - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90 % výtěžnosti, tj. 10 % ztraté. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz. bod 1),
 - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním čísle 241 471 148 – sklad a 257 015 748.

STRABAG

STRABAG a.s.
odětový závod Praha
Na Bělkole 188/21, 150 00 Praha 6
(3)

— 77 —

PŘÍLOHA č. 7

PŘÍLOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění podle čísel objektů:

Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně. Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

- a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku – (předat kopii znaleckého posudku)
- b) Hodnota komunikace
 - b.1.) vozovka
 - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
 - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
 - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/
 - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m² a dopravněbezpečnostní zařízení
 - b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
 - b.3.) demolice
 - b.4.) chráničky
 - b.5.) komunikační zeleň
 - b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
 - b.7.) schodiště
 - b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***
- c) Tunely (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)
- d) Mosty (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)
- e) Speciální objekty (pítka, nadzemní garáže,..), P+R, odtahy a vážení, zařízení pro zimní službu, zařízení pro přenosy dat
- f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/
- g) Zdi
- h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ
- i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic
- j) Objekty pro telematiku

*** tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

72
