



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/023

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2140-841/TC/21/19/08

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach - TDI

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 112071233/0300

zastoupená: Ing. Michael Procházka, na základě plné moci

Ing. Jan Černý, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
tel.: 602 316 311, e-mail: michael.prochazka@strabag.com

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
tel.: 602 227 269, e-mail: jan.02.cerny@strabag.com

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát (vedoucí PJ)
tel.: 724 861 792, e-mail: martin.pilat@strabag.com

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke

škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051- II.“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Sokolovská 16/45 A, 186 00 Praha 8.

Dílo je vymezeno následovně:

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně chodníku v rozsahu od ulice Dědinská po ulici Pilotů. Dojde k výměně všech konstrukčních vrstev a bude upravena křižovatka ulic Parašutistů – Dědinská. Vozovka je navržena s krytem z asfaltového betonu. Chodníky jsou navrženy z litého asfaltu. Chodníkové přejezdy jsou navrženy v betonové dlažby tl. 80 mm. Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem do nových uličních vpustí.

Zároveň se stavbou bude prováděna obnova veřejného osvětlení, kterou bude realizovat MHMP a bude s touto stavbou koordinována.

Součástí předmětu plnění je:

- zajištění DIR,
- projekt a realizace DIO,
- měření hladiny hluku po dokončení stavby dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 6, ul. Parašutistů
3. Zhotovitel se zavazuje řádně a efektivně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě smlouvy o dílo mezi hl. m. Prahou a objednatelem a realizační objednávky akce ze strany hl. m. Prahy a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení: **předpoklad níže**

Po uveřejnění smlouvy v registru smluv a dle vydaného DIR, které zajišťuje zhotovitel ihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li objednatel pozdější termín.

2. Termín dokončení: **max. do ...85... kalendářních dnů od zahájení prací**

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: ...85... kalendářních dnů

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termín dokončení o toto prodloužení prodlouží.

Zápisem do stavebního deníku potvrzeným zástupcem objednatele a zhotovitele je možné učinit přerušování stavebních prací. O toto přerušování se prodlužuje lhůta výstavby bez nutnosti změny smluvního vztahu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele do 5-ti pracovních dnů stavební práce obnovit.

3. Zhotovitel se zavazuje řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu, s ohledem na platné zákony a předpisy, zejména pak týkající se BOZP, hygienických předpisů, apod., aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.
4. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce odpovídá i přiložený harmonogram provádění prací.
5. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou koordinovány s obnovou veřejného osvětlení, kterou bude provádět MHMP.

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. Celkem cena za dílo bez DPH : 7 896 617,47 Kč
DPH : 1 658 289,67 Kč
Cena celkem včetně DPH : 9 554 907,14 Kč

Cena díla je blíže specifikována v příloze Položkový rozpočet.

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přejímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.

2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splátlost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.
7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatelů a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatelů, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitelů)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

6. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabulích uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umísťování těchto informačních tabulí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že

je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné zakázky v době jejího plnění, neboť má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky, což dokládá smlouvou o budoucí spolupráci, přičemž tuto smlouvu o budoucí spolupráci přikládá jako přílohu k této smlouvě.

6. Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl.VI. odst. 5. této smlouvy zhotovitel dokládá plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění díla v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstranění vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatel.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatel, je povinen na žádost objednatel práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatel (TP TSK).
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - geometrické plány
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítíZhotovitel je povinen dodat případně další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení.

Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.

2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.
5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,

8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčitě ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na

vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistí objednatel, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.
Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavatelé neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.
14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Zhotovitel zajistí dopracování projektové realizační dokumentace a zábor veřejného prostranství.
17. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektů.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

19. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní zkoušky předložil před podpisem smlouvy ke schválení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předloží naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další zkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci stavby. Všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto norem.
21. Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklad zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby.
22. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce.
23. V případě hlukového měření zajišťovaného zhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko od HSHMP.
24. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
25. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

XII.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **5 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webovských stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Položkový rozpočet
- Seznam poddodavatelů
- Smlouva o budoucí spolupráci
- Plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění díla v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na stavenišťe
- Hospodaření s vybouraným materiálem
- Tabulka aktivace HIM

V Praze dne 07. 06. 2019

V Praze dne 17. 06. 2019

objednatel

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.


zhotovitel

STRABAG a.s.



.....
Mgr. Jozef Sinčák


.....
Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103


.....
Ing. Michael Procházka
na základě plné moci


.....
Ing. Jan Čertý
na základě plné moci


STRABAG a.s.
Na Mlénské 115/271, 150 00 Praha 6
(20)

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
"Parasutistů, Praha 6, č. akce 9999051 - II"

1. Základní údaje: Název akce: Parasutistů, Praha 6, č. akce 9999051 - II. Místo: Praha 6. Stavba: ...

2. Účel: ...

3. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

4. Základní údaje: ...

5. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

6. Základní údaje: ...

7. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

8. Základní údaje: ...

9. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

10. Základní údaje: ...

11. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

12. Základní údaje: ...

13. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

14. Základní údaje: ...

15. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

16. Základní údaje: ...

17. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

18. Základní údaje: ...

19. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

20. Základní údaje: ...

21. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

22. Základní údaje: ...

23. Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů

V Praze dne 25.4.2019



STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bátě 190/21, 150 00 Praha 6
(3)

PRŮLOHA 0.1

Table with 4 columns: Účel, Stavba, Místo, Termín dokončení díla. Row 1: Účel: ... Stavba: ... Místo: ... Termín dokončení díla: 55 kalendářních dnů.

PETLOVA D. J.



CELKOVÁ REKAPITULACE

NA ZAKÁZKU

"Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051 - II"

NABÍDKOVÁ CENA (V Kč):	
Cena bez DPH:	7. 896. 677, 47 Kč
DPH (21%):	1. 657. 289, 67 Kč
Cena vč. DPH:	9. 554. 967, 14 Kč
LHŮTA VÝSTAVBY (VE DNECH):	
45 KALENDŘNÍCH DNY	
DĚLKA ZÁRUČNÍ DOBY (V MĚSÍCÍCH):	
60 MĚSÍCŮ NA STAVEBNÍ PRÁCI 36 MĚSÍCŮ NA VODOVODNÉ PŘIKLADÁNÍ	

V Praze dne 25. 4. 2019

.....
 Ing. Jan Černý
 v plné moci



.....
 Ing. Michael Procházka
 v plné moci

24

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-08

Stavba: Parašutistů, Praha 6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

7 896 617,47

0,00

7 896 617,47

Výše daně

1 658 289,67

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 554 907,14

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Rašíně - Praha 6 150 00 Praha 6
(8)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-08

Stavba: Parašutistů, Praha 6

Místo:

Datum: 25. 5. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

00	VRN	7 896 617,47	9 554 907,14	STA
01	Komunikace	493 661,06	597 329,88	STA
03	Sanace zemní pláně	6 485 413,98	7 847 350,92	STA
		917 542,43	1 110 226,34	STA

26



STRABAG s.r.o.
odělnický závod Praha
Na Švédě 195/21, 150 00 Praha 5
(3)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Plzeň - technický vedoucí oblasti**Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti****Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce





- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2019.

V Praze dne 25. 7. 2019
.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.
.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.**Zmocnění přijímám:**
.....
Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti
.....
Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti
.....
Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti**STRABAG**

STRABAG a.s.

obchodní rejstřík - oddíl B, vložka 7634
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Uchazeč: STRABAG a.s. IČ: 60838744
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Dle Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:

"Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051 - II"

musejí být níže uvedené položky součástí celkové nabídkové ceny a zároveň také uvedeny samostatně v přehledné tabulce.

Položka dle ZD	Cena v Kč bez DPH
Cena za dokumentaci skutečného provedení včetně dokumentace zaměření skutečného provedení v dig.formě. Výškové údaje budou v referenčním systému Bpv	58 472 Kč
Cena za geometrické plány dokončené stavby	62 441 Kč
Cena za DIO, DIR	180 318 Kč
Cena za měření hluků před započítím výstavby a po jejím skončení	25 000 Kč
Cena za měření vibrací během výstavby	20 000 Kč
Cena za pasportizaci a repasportizaci přílehlých objektů před a po stavbě	30 000 Kč
Cena za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti	70 000 Kč
Cena za odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku	400 084 Kč
Cena za informační panel stavby hl.m.Prahy	9 100 Kč
(Cena za oba informační panely může činit maximálně 9.100.-Kč bez DPH.)	--

Tyto položky jsou zahrnuty do celkové ceny a zároveň jsou zde uvedeny samostatně v přehledné tabulce dle požadavku zadavatele.
(dle ZD bod 7.1)

STRABAG

STRABAG a.s.
odělovny železd Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


(SEZNAM PODDODAVATELŮ VČ. IDENTIFIKAČNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ)



Účastník / dodavatel společnost STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, zastoupená zmocněnými osobami Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti, a Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti, jako dodavatel podávající nabídku na zhotovení zakázky s názvem "Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051-II" jejímž zadavatelem je Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s., se sídlem Rásovyka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 03447286, zastoupené Ing. Petrem Smolkou, generální ředitel a předseda představenstva a dále PhDr. Ing. Matějem Fichnerem, MBA, místopředseda představenstva, tímto

tímto předkládá soupis případných poddodavatelů, kteří se budou účastnit případné výstavby (pro STRABAG a.s.) výše uvedené stavby a dále čestně prohlašuje, že níže uvedené informace jsou pravdivé

Seznam poddodavatelů	
veřejná zakázka s názvem	% podíl na plnění VZ
"Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051 - II"	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatelé (předmát plnění jednotlivých subdodavatelů)



STRABAG a.s.
odšlépný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

PRŮLOHA J

54

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SAT, s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 5, Smíchov, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00		
IČ / DIČ:	494 51 251 / CZ494 51 251		100%
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Ing. Karel Secký, Radek Kudlička MBA - jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86500		
Tel./fax:	+420 417 569 443 / +420 417 579 514 / +420 602 429 359		
E-mail / web:	katerina.kucerova@sat-roads.com / http://www.sat-roads.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Pražské služby a.s.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 9, Pod Šancemi 444/1, PSČ 190 00		
IČ / DIČ:	601 94 120 / CZ60194120		07%
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	JUDr. Patrik Roman, Mgr.Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA, Petr Valent, Dr. Ing. Aleš Bláha, Ing. František Hodan - představenstvo společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2432		
Tel./fax:	+420 284 098 665 / +420 736 518 282 / +420 284 091 667		
E-mail / web:	iana.mackerfova@psas.cz / http://www.psas.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	OAT, s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Nedokonceňá 363, Praha 10, PSČ 102 00		
IČ / DIČ:	49616374 / CZ49616374		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Ing. Jaroslav Hvizdal, Ing. Karel Secký - jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21294		
Tel./fax:	+420 272 700 072 / +420 700 072		
E-mail / web:	oat@oat-cr.cz / http://www.oat-cr.cz		
		frézování	
		VDZ, SDZ, příp. DIO	
		spáry vč. výplni	



STRABAG a.s.
odštěpený závod Prahy
Na Bělidle 198/21
131

107

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Poddodavatelé CECKEM 19 % 24 =
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo invaleho pobytu:	
IČ / DIČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Tel./fax:	
E-mail / web:	

Uchazeč také čestně prohlašuje, že jakákoliv změna poddodavateliského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem a musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. Na vyžádání zadavatele účastník / dodavatel doloží kvalifikační poddodavatelů.

Toto prohlášení činíme na základě svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne: 25.4.2019

Ing. Jan Černý
 v plné moci
 STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
 oddělení závody Praha
 Na Štěrské 198/21, 150 00 Praha 6
 (3)

razítko:
 Ing. Michael Procházka
 v plné moci
 STRABAG a.s.

16

727 0114 @ . 4

Číslo smlouvy budoucího kupujícího:
Číslo smlouvy budoucího prodávajícího: 8/2019

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY

1. **Budoucí kupující:** **STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zápis v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
bankovní spojení: ČSOB a.s. účet: 112071233/0300
oprávněn k jednání: Ing. Jan Černý, v plné moci
Ing. Michael Procházka, v plné moci

(dále jen „budoucí kupující“)

2. **Budoucí prodávající:** **Společné obalovny, s.r.o.**
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, 100 00
zápis v Obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89505
IČ: 267 20 825
DIČ: CZ267 20 825
bankovní spojení:
oprávněn k jednání: Ing. Petr Beran, Ing. Aleš Friedrich, Marek Kebrt, Jan Vaculík,
jednatelé

(dále jen „budoucí prodávající“)

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy:

I. Úvodní ujednání

1. Budoucí kupující je oprávněn vyzvat v případě získané zakázky "**Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051 - II**" budoucího prodávajícího k uzavření smlouvy o dodávce asfaltových směsí.
2. Budoucí prodávající potvrzuje, že vlastní obalovny, příslušné vybavení, personál a oprávnění potřebná k výrobě asfaltových směsí v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP), Technickými podmínkami (TP), ČSN a dalšími předpisy. Budoucí prodávající též potvrzuje, že je držitelem Certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

II. Předmět smlouvy

1. V případě, že budoucí kupující uzavře se zadavatelem *Smlouvu o dílo* na zakázku definovanou v čl. I bodě 1 této smlouvy, budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím na jeho písemnou výzvu ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy budoucímu prodávajícímu Kupní smlouvu s podstatnými náležitostmi blíže specifikovanými v článku III. této smlouvy, v rámci které bude budoucí kupující označen jako "kupující" a budoucí prodávající jako "prodávající".

— 57 —

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

III. Náležitosti budoucí smlouvy

1. Předmět smlouvy.
 - 1.1. Budoucí prodávající se zavazuje provést pro budoucího kupujícího dodávky asfaltových směsí pro zakázku definovanou v čl. I bodě 1 této smlouvy v plném rozsahu a požadované kvalitě.
 - 1.2. **Dodávka bude realizována z obalovny Běchovice s výkonem (dle požadavku zadavatele VZ) min. 120 t/hod (typ zařízení WIBAU WKM 200, výkon – výrobní kapacita max. 240t/hod, na adrese: Mladých Běchovic 1911, 190 11 Praha 9 – Běchovice, okres Praha), vzdálenost od místa plnění do max. 40 km (ve skutečnosti do 39 km, tj. do cca 35 minut), kterou budoucí prodávající vlastní a provozuje a splňují celkovou vzdálenost od místa plnění (obalovna vzdálená v limitu pro dodržení ČSN a TKP). Dodávka bude splňovat požadavky obecně závazných předpisů a technických norem (TKP) platných v době podepsání smlouvy**
2. Cena díla a platební podmínky.
 - 2.1. Cena dodávek bude pevná a bude odvozena od jednotkových cen z nabídkové ceny budoucího prodávajícího předané budoucímu kupujícímu podle soupisu stavebních prací z projektové dokumentace.
 - 2.2. Splatnost faktur bude 21 dní.
3. Doba provádění díla
 - 3.1. Budoucí prodávající je povinen provádět dodávky v termínech a dle harmonogramu stanoveného ve smlouvě o dílo uzavřené mezi kupujícím a zadavatelem.
 - 3.2. Budoucí prodávající je přitom povinen respektovat návaznost dalších souvisejících prací a činností při realizaci zakázky jako celku.
 - 3.3. Budoucí kupující je povinen respektovat možnosti výrobních kapacit prodávajícího.
 - 3.4. **Předpokládaná lhůta výstavby: v období cca 04/2019 – 06/2020, příp. přesněji dle DIR.**

IV. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
2. Tato smlouva se ruší v případě, že nabídka, předložená budoucím kupujícím v zadávacím řízení vyhlášeném na **"Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051 - II"** nebude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější a zadavatel neuzavře s budoucím kupujícím smlouvu o dílo na realizaci zakázky.
3. Výzva budoucího kupujícího k uzavření budoucí smlouvy o dílo se považuje za doručenou také uplynutím lhůty 3 dnů ode dne prokazatelného odeslání budoucímu prodávajícímu.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, majících povahu originálu, přičemž budoucí kupující obdrží 2 vyhotovení a budoucí prodávající 1 vyhotovení.

STRABAG

STRABAG a. s.
udělovací závod Praha
Na Bělidle 196/21, 160 00 Praha 6
(3)

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne: 8. 4. 2019
budoucí kupující
za STRABAG a.s.

V Praze dne: 4.4.2019
budoucí prodávající
za Společné obalovny, s.r.o.

.....
Ing. Jan Černý
v plné moci
STRABAG a.s.

.....
Marek Kebrt
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.

.....
Ing. Michael Procházka
v plné moci
STRABAG a.s.

.....
Ing. Petr Beran
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 188/21, 160 00 Praha 6
(3)

.....
STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 188/21, 160 00 Praha 6
(3)

ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB NA DODÁVKU OBALOVANÝCH SMĚSÍ

pro stavbu:

"Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051 - II"

Potvrzujeme odběrateli obalovaných směsí:

STRABAG a.s. IČ:608 38 744, DIČ: CZ60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, zastoupená Ing. Jan Černý, v plné moci a Ing. Michael Procházka, v plné moci, vedená v OR Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634,

že jako dodavatel (tj. obalovna): obalovna Běchovice

Firma: **Společné obalovny, s.r.o.**

Sídlo: Dubečská 3238, 100 00 Praha 10


poskytneme živичné směsi v množství nutném pro řádné provedení příslušných prací na výše uvedené stavbu.

Dodávka bude uskutečněna v období : **předpoklad v období 04/2019 – 06/2020.**

V Praze dne: 4.4.2019



Ing. Petr Beran
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.



Marek Kebrt
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.



60
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

**Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 74 odst. 1 zákona**

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené v užším zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem:


"Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051 - II"


Čestně prohlašuji, že společnost Společné obalovny, s.r.o., dodavatel asfaltových směsí pro účastníka STRABAG a.s. v ZŘ na veřejnou zakázku výše uvedenou, splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 74 odst. 1 dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

- 1) § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- 2) § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- 3) § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- 4) d § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- 5) § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V případě požadavku zadavatele společnost Společné obalovny, s.r.o. doloží další požadované doklady.

V Praze dne: 4.4.2019


.....
Ing. Petr Beran
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.


.....
Marek Kebrt
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.

STRABAG

STRABAG a.s.
celkemilny zelezd Praha
Na Břevnově 198/21, 150 00 Praha 6
(3)

61

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 89505

Datum vzniku a zápisu:	21. srpna 2002
Spisová značka:	C 89505 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Společné obalovny, s.r.o.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Identifikační číslo:	267 20 825
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. ALEŠ FRIEDRICH, dat. nar. 30. dubna 1967 Polanecká 165, Václavovice, 742 83 Klimkovice Den vzniku funkce: 1. prosince 2016
jednatel:	MAREK KEBRT, dat. nar. 25. února 1958 Oblouková 559, 252 46 Vrané nad Vltavou Den vzniku funkce: 7. dubna 2016
jednatel:	Ing. PETR BERAN, dat. nar. 22. března 1964 Luční 923, 464 01 Frýdlant Den vzniku funkce: 7. dubna 2016
Jednatel:	JAN VACULÍK, dat. nar. 10. února 1962 č.p. 26, 687 41 Hostějov Den vzniku funkce: 10. dubna 2018
Způsob jednání:	Jménem společnosti jednají vždy dva jednatele společnosti tak, aby každý společník byl zastoupen svým zástupcem, tj. jednatele jednají takto: - Ing. Petr Beran spolu s Markem Kebртом - Ing. Petr Beran spolu s Janem Vaculíkem - Ing. Aleš Friedrich spolu s Markem Kebртом - Ing. Aleš Friedrich spolu s Janem Vaculíkem
Společníci:	
Společník:	STRABAG Asfalt s.r.o., IČ: 251 86 183 Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav
Podíl:	Vklad: 2 500 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
Společník:	PORR a.s., IČ: 430 05 560 Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Podíl:	Vklad: 2 500 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní

Ke dni 1.10.2012 zanikl společník Pražské silniční a vodohospodářské stavby,

STRABAG

STRABAG a.s.
výšleňny zav. f Praha
Na Přáhl: 194/21, 150 00 Praha 6
(3)

a.s., identifikační číslo 452 73 910 fúzí sloučením s Porr(Česko) a.s., identifikační číslo 430 05 560, která je nástupnickou společností; od 1.10.2012 používá nástupnická společnost obchodní firmu Porr a.s.

Základní kapitál: 5 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


Počet členů statutárního orgánu: 4

67

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Pěšince 160/21, 150 00 Praha 6
(3)

PLAN DOPRAVNÍ TRASY S UVEDENÍM VĚDĚNOSTI K MÍSTU PUKNUTÍ
 V LK, PO KTERÉ BUDE DOPRAVTELE ZAVIŇTOVAT VĚRNĚM PODÁTKEM
 POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ NA VYKLENUTÍ

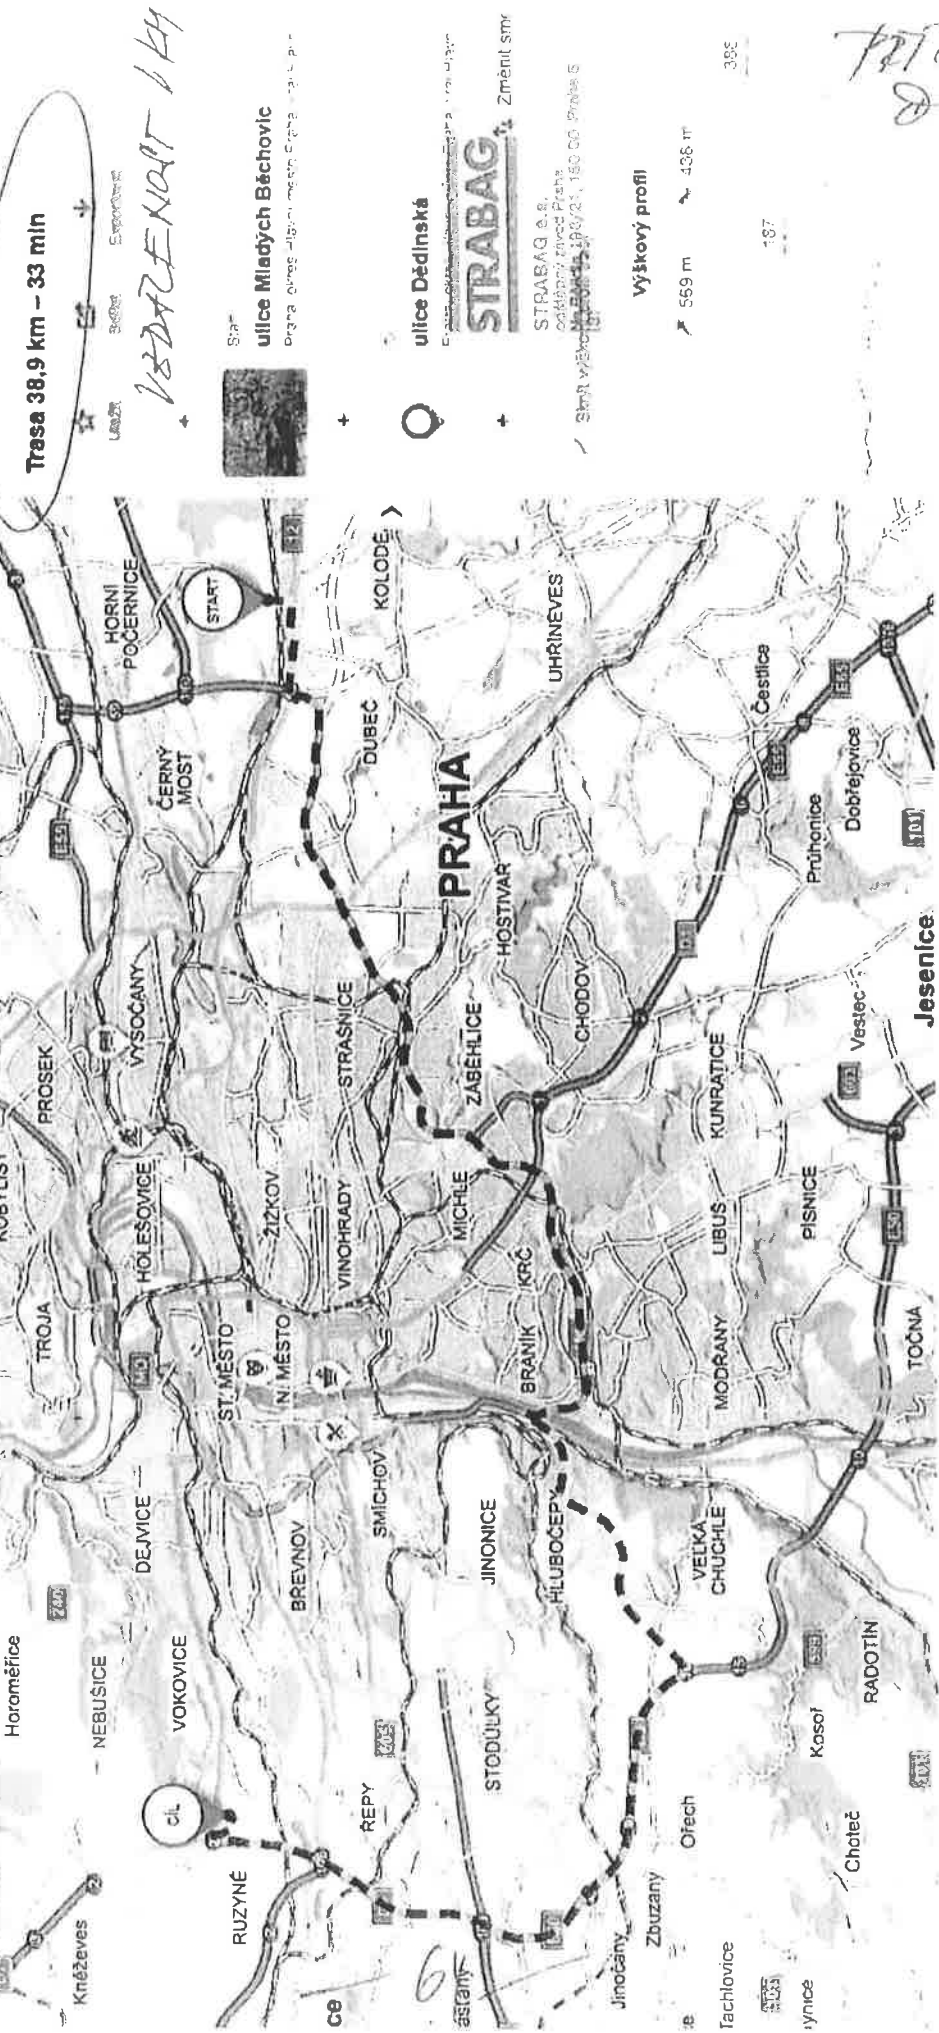

PRÍLOHA
 2

12. PRAKTICKÁ, PRAHA 6, Č. X KOF 999 057 - I

PRŮLOHA 0.6

- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
- po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad -- příjmemku.
- 5) Proce s odvozem dlažby je ukončen:
- odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90 % výtěžnosti, tj. 10 % ztráté. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz. bod 1),
 - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jim být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním čísle 241 471 148 - sklad a 257 015 748.

STRABAG

STRABAG a.s.
Grüßlepfny závod Praha
Na Hlubočce 106/21, 180 00 Praha 6
(8)

PŘÍLOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění podle čísel objektů:

Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně. Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku – (předat kopii znaleckého posudku)

b) Hodnota komunikace

- b.1.) vozovka
 - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
 - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
 - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/
 - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m2 a dopravněbezpečnostní zařízení
- b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
- b.3.) demolice
- b.4.) chráničky
- b.5.) komunikační zeleň
- b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
- b.7.) schodiště
- b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***

c) Tunely (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)

d) Mosty (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)

e) Speciální objekty (pítka, nadzemní garáže,..),
P+R,
odtahy a vážení,
zařízení pro zimní službu,
zařízení pro přenosy dat

f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/

g) Zdi

h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ

i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic

j) Objekty pro telematiku

*** tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.

66

